



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2IV2119018**



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	2IV2119018.- "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA"		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO Q.ROO	Localidad:	POLINKIN
Origen del Recurso:	Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	RAMO 33.- FISDMF
Siendo las	10:00	horas del día	22 del mes de AGOSTO del año 2017

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V." representada por el C. TCO. JOSE MIGUEL MORENO PALOMEQUE en su carácter de representante legal acompañado en este acto por el superintendente de obra, C. TEC.LUIS O. MALDONADO ALAMILLA; la Dependencia Ejecutora representada por el C. ING. JEREMIAS CABRERA BASTO Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. RENAN JESUS BORGES PADILLA, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en :

CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA QUE INCLUYE: CAPITULO I.- CUBIERTA, II.- INSTALACION ELECTRICA

Información contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISDMF17-LP-17/2017	Importe con IVA incluido:	1'066,055.74
Garantía de anticipo:	1799818	Importe:	\$ 319,816.72
Garantía de cumplimiento:	1799813	Importe:	\$ 106,805.57
Fianza de vicios ocultos:	1828474	Importe:	\$ 102,555.38

PERIODO DE CONTRATO

Fecha de inicio de contrato:	08 DE MAYO DE 2017
Fecha de terminación de contrato:	05 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO REAL


Fecha de inicio real:	12 DE MAYO DE 2017
Fecha de terminación real:	09 DE AGOSTO DE 2017



En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISDMF17-LP-17/2017	Fecha de Convenio:	15 DE JULIO 2017
Plazo de ejecución:	90 DIAS	Importe final contratado:	1'025,553.79

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (Uno)	\$ 305,340.08	
2 (dos)	\$ 464,300.42	
3 (tres, última y finiquito)		\$ 255,913.29
Sumas	\$ 1,025,553.79	\$ 255,913.29
Inversión Ejercida	\$ 1,025,553.79	\$ 255,913.29


**SUBDELEGACIÓN
POLINKIN**
 MUNICIPIO
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 QUINTANA ROO



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
21V2119018**



En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejecida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

La empresa "CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V." y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa

"CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V."

TCO. JOSE MIGUEL MORENO PALOMEQUE
Representante Legal

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Públicas

C. RENÁN JESUS BORGES PADILLA
Residente de la Obra


Por el Comité de Obra

Nombre: ANGELA MARIA MEDINA ALFARO
Cargo: PRESIDENTA DEL COMITÉ

Testigos

Por el Órgano de Control

Nombre: ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Cargo: SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MPAL.


 PEDRO ALFARO
**SUBDELEGACIÓN
POLINKIN**
 MUNICIPIO
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 QUINTANA ROO



CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

R.F.C. CMA-88120-L83 C.M.I.C. 74071 MEX. E29-18381-10
AV. ARBORESCENTE FERNANDEZ 9 106 COL. FORJADORES TEL. (911) 943
12-7-36-64 CORREO: constructora_mogu@hotmail.com CHETUMAL, Q. ROO.

PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA	FECHA DE ELABORACION:	
LOCALIDAD:	POLINKIN, QUINTANA ROO		12 DE JULIO DE 2017
MUNICIPIO:	FELIPE CARRILLO PUERTO		
No. CONTRATO:	OP-FCP-FISMDF17-LP-17/2017		
OFICIO DE APROBACION:	DPM-FISMDF17-FCP-018 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017		
No. CEDULA:	21V2119018		

No	CLAVE	DESCRIPCION	U/M	PRES. CONTRATADO		PRES. FINAL		
				P.UNI	CANT.		IMPORTE	
	50EX-422	CAP. I.- CUBIERTA. LOSA DE VIGUETA T-12.5 Y BOVEDILLA DE 15X23X36 CMS, CON CAPA DE COMPRESION DE 4 CM. DE ESPESOR Y CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10X10/6-6. INCLUYE MICROFIBRA POLIPROPILENO PARA EL AGRIETAMIENTO "FIBRAFEST", CON NORMA ASTM C 1118, 1 PRUEBA DE LABORATORIO @ 30 M2, HABILITADO, CIMBRA Y DESCIMBRA DE LATERALES, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$	903.65	584.88	\$	528,526.81
	SCUB-002	PRETEL A BASE DE UNA FILA DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. DE SECCION (VER DETALLE EN CROQUIS). ACABADO A TRES CAPAS EN SU PARTE SUPERIOR E INTERIOR UNICAMENTE Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2:8. INCLUYE: PERFILACION A BASE DE REGLAS Y TUBULARES METALICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	\$	202.65	392.45	\$	79,529.99
	SAYR-003	CALCRETO EN LOSA DE AZOTEA CON MORTERO CEMENTO CAL-POLVO-GRAVA EN PROPORCION 1:18:27:36 CON PENDIENTE 1% Y ESPESOR DE 3 CM. EN PROMEDIO. INCLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO."	M2	\$	187.76	523.13	\$	98,222.89
	SCUB-005	CHAFLAN DE 5 X 5 CMS. A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA, EN PROP. 1:2:8. INCLUYE: ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	\$	53.50	380.15	\$	20,338.03
	SHID-500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PREFABRICADA DE CONCRETO DE 30 CM. PARA DESAGUE PLUVIAL, EN LOSA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	\$	170.64	36.00	\$	6,143.04
	SAYR-700	APLANADO EN MURO DE BLOCK HUECO A TRES CAPAS TIPO FINO CON ESPESOR TOTAL PROMEDIO DE 2.5 CM, LA PRIMERA CAPA (RICH) CON MORTERO CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1:2:5, LA SEGUNDA CAPA (EMPARCHE) CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2:8 Y LA TERCERA CAPA (ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO CERNIDO EN PROPORCION 1:18:9. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$	196.89	161.02	\$	31,703.23
	SAYR-008	APLANADO EN MURO DE BLOCK HUECO O PLAFOND A TRES CAPAS, LA PRIMERA CAPA (RICH) CON MORTERO CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1:2:5, LA SEGUNDA CAPA (EMPARCHE) CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2:8 Y LA TERCERA CAPA (ESTUCO) CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO CERNIDO EN PROPORCION 1:18:9 ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$	195.93	523.13	\$	102,496.86
	TOTAL	CAP. I. CUBIERTA					\$	866,960.84

ELABORO:

TEC. LUIS OSWALDO MALDONADO RAMILLA
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

Vo.Bo.:

TEC. JOSE MIGUEL MORENO PALOMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

REVISO:

TEC. RENAN FELIPE RODRIGUES RAMILLA
RESIDENTE DE OBRAS PUB.

Vo.Bo.:

ING. JEREMIAS LABRERA BASTO
DIR. DE OBRAS PUB.

Petrou me Lou...



**SUBDELEGACION
POLINKIN**
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO



CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

R.F.C. CMA-000120-33 C.M.F.C. 74071 M.B.S. E28-10381-10
 AV. AMARILLO PERMANEZ # 106 COL. FORJADORES TEL. (91) 883
 12-1-28-84 CORREO: constructora_mogu@hotmail.com CHETUMAL, Q. ROO

PRESUPUESTO DEFINITIVO			
OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA		FECHA DE ELABORACION:
LOCALIDAD:	POLINKIN, QUINTANA ROO		12 DE JULIO DE 2017
MUNICIPIO:	FELIPE CARRILLO PUERTO		
No. CONTRATO:	OP-FCP-FISMDF17-LP-17/2017		
OFICIO DE APROBACION:	DPM-FISMDF17-FCP-018 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017		
No. CEDULA:	2IV2119018		

No	CLAVE	DESCRIPCION	U/M	PRES. CONTRATADO		PRES. FINAL	
				P.UNI	CANT.	IMPORTE	
	SELE-A51	CAP. II.- INSTALACION ELECTRICA. SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR O CONTACTO, INCLUYE CHALUPA, REGISTRO, POLIFLEX DE 1/2", CABLEADO #14, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, RANURA, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	\$ 705.97	18.00	\$	12,707.46
	SELE-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO AHORRADORA DE 15 WATTS LUZ FRIA, INCLUYE: SOQUET DE BAQUELITA, LUMINARIA, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 123.05	36.00	\$	4,429.80
	TOTAL	CAP. II. INSTALACION ELECTRICA				\$	17,137.26
SUBTOTAL:						\$	884,098.10
16.00% DE I.V.A.:						\$	141,455.69
TOTAL PRESUPUESTO:						\$	1,025,553.79

RESUMEN GENERAL

PARTIDAS				PRES. FINAL
1.00	CAP. I.- CUBIERTA.			\$ 866,960.84
2.00	CAP. II.- INSTALACION ELECTRICA.			\$ 17,137.26
SUBTOTAL:				\$ 884,098.10
16.00% DE I.V.A.:				\$ 141,455.69
TOTAL PRESUPUESTO:				\$ 1,025,553.79

ELABORO:

TEC. LUIS OSWALDO MALDONADO ALAMILLA
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

Vo.Bo.:

TEC. JOSE MIGUEL MORENO PALOMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A.

REVISO:

TEC. RENAN SUS BORGES PADILLA
RESIDENTE DE OBRAS PUB.

Vo.Bo.:

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO
DIR. DE OBRAS PUB.

Petron...



SUBDELEGACIÓN POLINKIN
MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018



CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADA S.A. DE C.V.

R.F.C. CMA 800120433 C.M.I.C. 74071 BASS. E28-1998/10
 AV. ALBERCIBO FERNANDEZ # 108 COL. FOMADORES TEL: (01 800) 17-28-54 CORREO: constructora_mogu@outlook.com CUCUTIMAL Q ROO

TABLA COMPARATIVA DE AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CONTRATO

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA		PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADO CONFORME A CONTRATO:		FECHA DE ELABORACION:
OBRA	BOVEDILLA	INICIO	TERMINO	12 DE JULIO DE 2017
LOCALIDAD	POLINKIN, QUINTANA ROO	8 de mayo de 2017	5 de agosto de 2017	
MUNICIPIO	FELIPE CARRILLO PUERTO	PERIODO DE EJECUCION DE FECHA DE INICIO REAL CONFORME PAGO DE ANTICIPO:		
No. CONTRATO	OP-FCF-FISMDF17-LP-172017	DEL 12 de mayo de 2017	AL 9 de agosto de 2017	
OFICIO DE APROBACION	DPM-FISMDF17-FCF-018 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017	PERIODO DE EJECUCION DEFINITIVO BAJO CONVENIO MODIFICATORIO CMI-01-OP-FCF-FISMDF17-LP-172017:		
No. CEDULA	21V2119018	DEL 12 de mayo de 2017	AL 9 de agosto de 2017	

No	CLAVE	DESCRIPCION	UM	CANT	PRES. CONTRATADO		ADITIVAS (+)		DEDUCTIVAS (-)		PRES. FINAL
					P. UNI	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	
50EX-422	1	CAP. I- CUBIERTA. LOSA DE VIGUETA T-12 S Y BOVEDILLA DE 15X25X66 CMS, CON CAPA DE COMPRESION DE 4 CM. DE ESPESOR Y CONCRETO F'c=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10X106-6. INCLUYE: MICROFIBRA POLIPROPILENO PARA EL AGRIETAMIENTO "FIBRAFAST" CON NORMA ASTM C 1116, 1 PRUEBA DE LABORATORIO @ 30 MZ, HABILITADO, CIMBRA Y DESCIMBRA DE LATERALES, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	600.00 \$	903.65 \$	542,190.00 \$	0.00 \$	-15.12 \$	13,663.19 \$	584.88 \$	528,526.81 \$
50UB-002		PRETL A BASE DE UNA FILA DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS DE SECCION (VER DETALLE EN CROQUIS), ACABADO A TRES CAPAS EN SU PARTE SUPERIOR E INTERIOR UNICAMENTE Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2.6. INCLUYE: PERFILACION A BASE DE REGLAS Y TUBULARES METALICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	428.00 \$	202.65 \$	86,734.20 \$	0.00 \$	-35.55 \$	7,204.21 \$	392.45 \$	79,529.99 \$
5AYR-003		CALCRETO EN LOSA DE AZOTEA CON MORTERO CEMENTO CAL-POLVO-GRAVA EN PROPORCION 1 19.27:36 CON PENDIENTE 1% Y ESPESOR DE 3 CM. EN PROMEDIO. INCLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	535.80 \$	187.76 \$	100,601.81 \$	0.00 \$	-12.67 \$	2,378.92 \$	523.13 \$	98,222.89 \$
50UB-005		CHAFLAN DE 5 X 5 CMS. A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA, EN PROP. 1:2.6. INCLUYE: ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	416.00 \$	53.50 \$	22,256.00 \$	0.00 \$	-35.85 \$	1,917.98 \$	380.15 \$	20,338.03 \$
5HID-500		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PREFABRICADA DE CONCRETO DE 30 CM. PARA DESAGUE PLUVIAL, EN LOSA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	40.00 \$	170.64 \$	6,825.60 \$	0.00 \$	-4.00 \$	682.56 \$	36.00 \$	6,143.04 \$

ELABORO:

REVISO:

Vo.Bo.:

TEC. LUIS OSWALDO MALDONADO ALAMILLO SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

TEC. JOSE MIGUEL MORENO PALOMEQUE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

TEC. JEREMIAS CABRERA BASTO DIR. DE OBRAS PUB.

MUNICIPIO POLINKIN SUBDELEGACION INC. JEREMIAS CABRERA BASTO DIR. DE OBRAS PUB.



CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIAD S.A. DE C.V.

R.F.C. OVA-80010033 C.M.I.C. 74071 BASE EXH-1001-10
AV. ALONSO DE ERNANDEZ S 108 COL. FOLIAVERDES TEL. (011) 80 17 27 28-84 CORREO comercial_mogu@outlook.com CICTUNAL Q. 8701

TABLA COMPARATIVA DE AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CONTRATO

OBRA		PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADO CONFORME A CONTRATO:				PERIODO DE EJECUCION DEFINITIVO BAJO CONVENIO MODIFICATORIO CM-01-OP-FCP-FISMDF17-LP-172017:		FECHA DE ELABORACION:
LOCALIDAD	MUNICIPIO	No. CONTRATO	OFICIO DE APROBACION	No. CEDULA	INICIO	TERMINO	DEL	12 DE JULIO DE 2017
BOVEDILLA	POLINKIN, QUINTANA ROO	FELIPE CARRILLO PUERTO	DPM-FISMDF17-FCP-018 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017	21V2119018	8 de mayo de 2017	5 de agosto de 2017	12 de mayo de 2017	
		OP-FCP-FISMDF17-LP-172017			12 de mayo de 2017	9 de agosto de 2017	AL	
					13 de mayo de 2017	9 de agosto de 2017	AL	

No	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRES. CONTRATADO		ADITIVAS (+)		DEDUCTIVAS (-)		PRES. FINAL	
				CANT	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
5AYR-700		APLANADO EN MURO DE BLOCK HUECO A TRES CAPAS TIPO FINO CON ESPESOR TOTAL PROMEDIO DE 2.5 CM. LA PRIMERA CAPA (RICH) CON MORTERO CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1:2.5. LA SEGUNDA CAPA (EMPARCHÉ) CON MORTERO CEMENTO-CAL. POLVO EN PROPORCION 1:2.6 Y LA TERCERA CAPA (ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO CERNIDO EN PROPORCION 1:1.8.9. INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	184.8000	\$ 36,385.27	0.00	\$	-23.78	-\$ 4,687.04	161.02	\$ 31,707.23
5AYR-008		APLANADO EN MURO DE BLOCK HUECO O PLAFOND A TRES CAPAS. LA PRIMERA CAPA (RICH) CON MORTERO-CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1:2.5. LA SEGUNDA CAPA (EMPARCHÉ) CON MORTERO-CEMENTO-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2.6 Y LA TERCERA CAPA (ESTUCCO) CON MORTERO-CEMENTO-CAL-POLVO CERNIDO EN PROPORCION 1:1.8.9. ACABADO FINO. INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	535.8000	\$ 104,979.29	0.00	\$	-12.67	-\$ 2,482.43	523.13	\$ 102,496.86
5ELE-051		CAP. II.- INSTALACION ELECTRICA. SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR O CONTACTO. INCLUYE. CHALUPA, REGISTRO. POLIFLEX DE 1/2" CABLEADO #14, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, RANURA, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	20.0000	\$ 14,119.40	0.00	\$	-2.00	-\$ 1,411.94	18.00	\$ 12,707.46
5ELE-010		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO AHORRADORA DE 15 WATTS LUZ FRIA, INCLUYE: SOQUET DE BAQUELITA, LUMINARIA, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CAP. II. INSTALACION ELECTRICA	PZA	40.0000	\$ 4,922.00	0.00	\$	-4.00	-\$ 492.20	36.00	\$ 4,429.80
		SUBTOTAL:			\$ 919,013.57		\$		-\$ 34,915.47		\$ 884,098.10
		16.00% DE I.V.A.:			\$ 147,042.17		\$		-\$ 5,586.48		\$ 141,455.69
		TOTAL PRESUPUESTO:			\$ 1,066,055.74		\$		-\$ 40,501.95		\$ 1,025,553.79

ELABORO:

Vo.Bo.:

ING. JEREÑAS CARRERA BASTRO
DIR. DE OBRAS PUB.

TEC. JOSE MIGUEL ACIENNO PALOMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

TEC. FELIPE CARRILLO PUERTO
RESIDENTE DE OBRAS PUB.

TEC. LUIS OSWALDO MALDONADO ALSAMILLA
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

MUNICIPIO
SUBDELEGACION
POLINKIN
QUINTANA ROO



CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. 08A-0001815 C.A.H.C. 74071 INC. E25-10011-10
 AL. JUAN CARLOS FERNANDEZ # 108 COL. FOUADORES TEL. (01) 985 137-34-44 CORREO: constructora_mogu@msn.com CIENTAFUM, Q. ROO.

TABLA COMPARATIVA DE AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CONTRATO

OBRA		PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADO CONFORME A CONTRATO:				FECHA DE ELABORACION:
LOCALIDAD:	BOVEDILLA	INICIO	TERMINO:			12 DE JULIO DE 2017
		8 de mayo de 2017	5 de agosto de 2017			
MUNICIPIO	POLINKIN, QUINTANA ROO	PERIODO DE EJECUCION DE FECHA DE INICIO REAL CONFORME PAGO DE ANTICIPO:				
		DEL	AL			
		12 de mayo de 2017	9 de agosto de 2017			
No. CONTRATO	OP-FCP-FISMDF17-LP-172017	PERIODO DE EJECUCION DEFINITIVO BAJO CONVENIO MODIFICATORIO CM-01-OP-FCP-FISMDF17-LP-172017:				
		DEL	AL			
		12 de mayo de 2017	9 de agosto de 2017			
No. CEDULA	2142119018					

No	CLAVE	DESCRIPCION	U/M	CANT	PRES. CONTRATADO		ADITIVAS (+)		DEDUCTIVAS (-)		PRES. FINAL
					IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	

RESUMEN GENERAL

PARTIDAS		IMPORTE	%	ADITIVAS (+)	%	DEDUCTIVAS (-)	%	PRES. FINAL
1.00	CAP. I.- CUBIERTA.	\$ 899,972.17	97.93%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 866,960.84
2.00	CAP. II.- INSTALACION ELECTRICA.	\$ 19,041.40	2.07%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 17,137.26
SUBTOTAL:		\$ 919,013.57	100.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 884,098.10
16.00% DE I.V.A.:		\$ 147,042.17		\$ -		\$ -		\$ 141,455.69
TOTAL PRESUPUESTO:		\$ 1,066,055.74		\$ -		\$ -		\$ 1,025,553.79

ELABORO:

 TEC. LUIS OSWALDO MALDONADO ALAMILLA
 SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

Vo.Bo.:

REVISO:

TEC. RENATAS BORGES ABALLA
 RESIDENTE DE OBRAS PUB.

Vo.Bo.:

ING. GERARDO CABRERA BASTO
 DIR. DE OBRAS PUB.

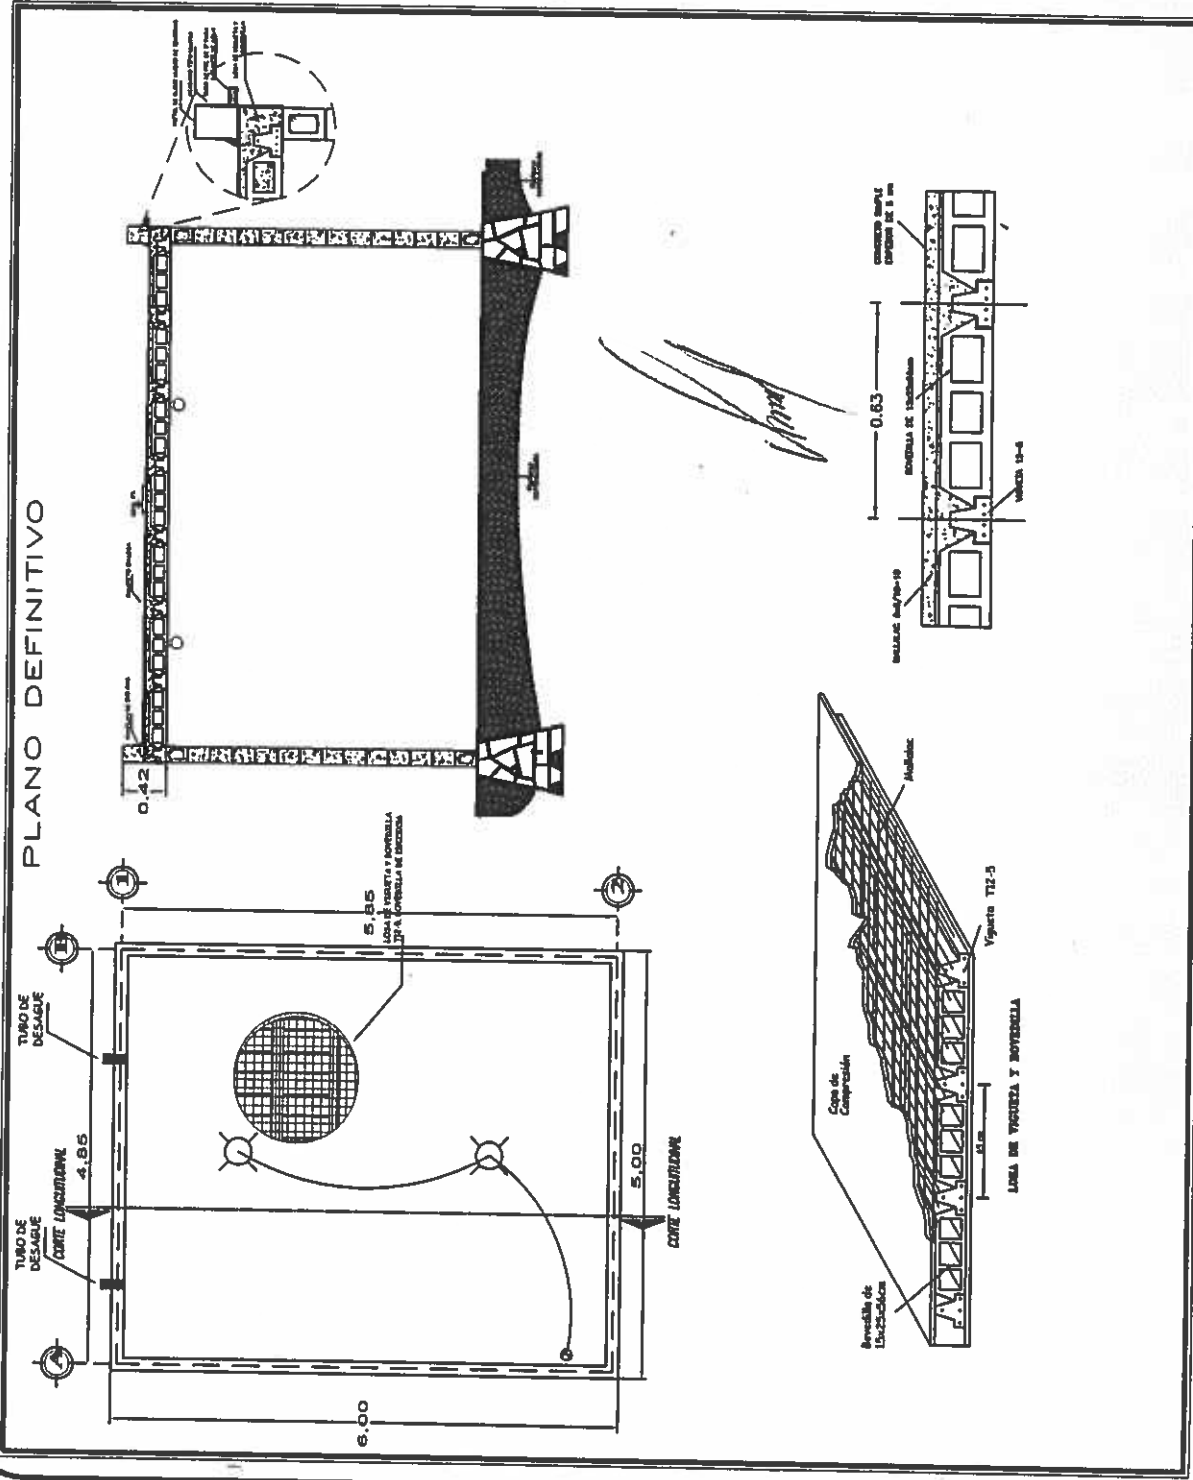


SUBDELEGACION POLINKIN
 MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO
 QUINTANA ROO
 2016 - 2018

**CONSTRUCTORA M.D. Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.**

R.F.C. CMA800120L5 C.M.I.C. 74071 IMSS E29-10091-10
AV. ARCONERINO FERNÁNDEZ # 106 CCL FORJADORES TEL. (01) 986 127-26-64
CORREO: constructora_md@gmail.com CETUMAL, Q. ROO

PLANO DEFINITIVO



Revisión



**DELEGACIÓN
POLINKIN**
MUNICIPIO
SAN JUAN PUERTO
QUINTANA ROO
2015-2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



POLINKIN

CONSTRUCCION DE TECHO FIRMEDE VIGUETA Y BOVEDILLA
CROQUIS DEFINITIVO

- 1.-ELIAS BALAM BALAM
- 2.-MARISOL ALFARO CANUL
- 3.-ANGELA MEDINA ALFARO
- 4.-JOSE ANGEL POOT CHAN
- 5.-PETRONA MEDINA ALFARO
- 6.-IRMA MEDINA ALFARO
- 7.-MARTHA HERNANDEZ FLORES
- 8.-MANUEL MEDINA ALFARO
- 9.- HILIANA ALFARO CANUL

- 10.-OLEGARIO JIMENEZ YAM
- 11.-MARVIN POOT ALFARO
- 12.-ROMAN CHAN ALFARO
- 13.-JUAN MEDINA ALFARO
- 14.-MACEDONIA BALAM BALAM
- 15.-ELVIRA ALFARO JUCHIN
- 16.-CLAUDIA ARIAS PEREZ
- 17.-ROGELIO BALAM ALFARO
- 18.-FLORENCIO MEDINA ALFARO



SUBDELEGACIÓN
Petrona y Hércules Alfaro

