



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 párrafo 1 y 62 de la Ley de Obras Públicas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento, se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO		
Cédula y Nombre de la Obra	2V5312025.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO.		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	CHUNHUB
Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio		RAMO 33.- FISM
Siendo las <u>12:00 HRS.</u> horas del día <u>28</u> del mes de <u>NOVIEMBRE</u> del año <u>2017</u>			
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. representada por el C. TCO. JOSE MIGUEL MORENO PALOMEQUE en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL; Acompañando por su superintendente el C. TEC. LUIS O. MALDONADO ALAMILLA. la Dependencia Ejecutora representada por el ING. JEREMIAS CABRERA BASTO Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. TEC. GEYDEN HUCHIN CANUL, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en :			
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 2V5312025.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO. EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUB, Q. ROO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 6,654.00 METROS CUADRADOS.			
Información contractual			
No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF17-IR-25/2017	Importe con IVA incluido:	\$ 2,008,150.11
Garantía de anticipo:	1822411	Importe:	\$ 602,445.04
Garantía de cumplimiento:	1822412	Importe:	\$ 200,815.01
Fianza de vicios ocultos:	1858208	Importe:	\$ 228,475.35
Fecha de inicio de contrato:	31 DE JULIO DE 2017	Fecha de inicio real:	10 DE AGOSTO DE 2017
Fecha de terminación de contrato:	28 DE OCTUBRE DE 2017	Fecha de terminación real:	07 DE NOVIEMBRE DE 2017
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF17-IR-25/2017	Fecha de Convenio:	02 DE OCTUBRE DE 2017
Plazo de ejecución:	DEL 10 DE AGOSTO DE 2017 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	Importe final contratado:	\$ 2,284,753.51
SE MODIFICO EL TOTAL DE VOLUMENES CONTRATADO EN ADITIVAS Y DEDUCTIVAS COMO CONSECUENCIA DE LA MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS CON CLAVES: 5RASTRED, 5BCH-FCP, 5PORE-01, 5PAVCA03 Y AL MISMO TIEMPO SE ANEXA UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO CON CLAVE 5RENIVEL DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CONCURSADO.			

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
No.- 1	\$ 708,555.04	
No.- 2	\$ 1,100,323.79	
No.- 3	\$	\$ 300,360.54
No.- 4 (Finquito)	\$	\$ 175,514.14
Sumas	\$ 2,284,753.51	\$ 475,874.68
Inversión Ejecida	\$ 2,284,753.51	

ALCALDÍA DE
CHUNHUB
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

la empresa CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el 46 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
STRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE

TEC. LUIS O. MALDONADO ALAMILLA
Superintendente
Nombre y Firma

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Públicas

TEC. GEYDER HUGO CANUL
Residente de Obra
Nombre y Firma

Testigos

Por el Comité de Obra

Presidente del comité de obra
Nombre, Cargo y Firma

DIRECCION DE PLANEACION

Nombre, Cargo y Firma

ALCALDE DE LA CALIDAD

C. MARIA MANUELA CAN CHUC

Por el Órgano de Control

Supervisor de La Contaduría Municipal
Nombre, Cargo y Firma

Por la SEDESOL

Nombre, Cargo y Firma



ALCALDÍA DE CHUNHUHUB
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018



**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 2V5312025.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: CHUNHUHUB

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio RAMO 33.- FISM

Siendo las 12:00 horas del día 28 del mes de NOVIEMBRE del año 2017; los representantes de las Entidades y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Dirección de Obras Públicas representada por el C. TEC. GEYDEN HUCHIN CANUL en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra 2V5312025 REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, a la Dirección de Obras Públicas representada por el C. TEC. SAMUEL CHUC EK en su carácter de sobrestante de conservación y mantenimiento de calles y caminos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 2V5312025.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO. EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB, Q. ROO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 6,854.00 METROS CUADRADOS.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

C. TEC GEYDEN HUCHIN CANUL
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS
Nombre, Cargo y Firma

Por la Normativa

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
Nombre, Cargo y Firma

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

C. TEC. SAMUEL CHUC EK
SOBRESTANTE DE OBRAS PUBLICAS
conservacion y mantenimiento


Testigos

Por la DIR. DE PLANEACION

Nombre, Cargo y Firma

Por la Oficialía Mayor

Nombre, Cargo y Firma



ALCALDÍA DE CHUNHUHUB
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

11

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RESUMEN**

OBRA: REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CM. DE ESPESOR COMPACTO.		
LOCALIDAD: CHUNHUHUB, Q. ROO.		
Nº. CONTRATO: OP-FCP-FISMDF17-IR-25/2017 DE FECHA 24-JUL-17		
CLAVE: No.	CONCEPTO	IMPORTE
	CAP. I.- PRELIMINARES	21,985.66
	CAP. II.- PAVIMENTACION	1,580,157.86
	CAP. III.- PRUEBAS DE LABORATORIO.	20,869.20
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	346,602.37
	SUMA:	1,969,615.09
	16 % I.V.A.	315,138.42
	TOTAL:	2,284,753.51

EL DIRECTOR DE OBRAS


ING. JEREMIAS CABRERA BASTO

CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C

TEC LUIS O. MALDONADO ALAMILLA

EL SUPERVISOR

C. GEYDEN O. HUBHIN CANUL


**ALCALDÍA DE
CHUNHUHUB**
 MUNICIPIO
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 QUINTANA ROO
 2015-2019

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA: REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CM. DE ESPESOR COMPACTO.					
LOCALIDAD: CHUNHUB, Q. ROO.					
CLAVE: No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
CAP. I.- PRELIMINARES					
5RASTREO	RASTREO, DESTRONQUE, RETIRO DE MALEZA Y MATERIAL CONTAMINADO DE LOS LATERALES DE LA CALLE DEPOSITANDO EL MATERIAL HASTA 1 KM FUERA DEL AREA DE TRABAJO INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	9.49	1,774.40	16,839.06
5BCH-FCP	BACHEO DENTRO DEL ANCHO DE CORONA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 3.0 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, INCLUYE: RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.3 LT/M2. CAJEO, CALCE DEL BACHEO BACHEO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y COMPACTACIONA BASE DE RODILLO DE 1 TON. MINIMO.	M2	179.70	28.64	5,146.61
TOTAL CAPITULO:					21,985.66
CAP. II.- PAVIMENTACION					
5BARR101	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, TRABAJOS PREVIOS AL POREO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	HA	24,887.35	0.710	17,670.02
5PRE-01	POREO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE A CON GRANULOMETRIA DE 3/8" A FINOS, CON EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 1.1 LT/M2, INCLUYE: FLETE DE MAQUINARIA, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MATERIALES.	M2	54.89	7,097.60	389,562.56
5PAVCA03	PAVIMENTACION DE 3.00 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE ELABORADO EN PLANTA CON UNA GRANULOMETRIA DE 3/8" A FINOS, APLICACION DE 1.00 LTS. DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO SUPERESTABLE CATIONICA POR M2, TENDIDO CON PAVIMENTADORA Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: FLETES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.	M2	176.27	6,654.00	1,172,900.58
TOTAL CAPITULO:					1,580,157.86
CAP. III.- PRUEBAS DE LABORATORIO.					
5PRUEPER	PRUEBA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA PERMEABILIDAD EN LA CARPETA ASFALTICA APLICADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PBA	521.73	20.00	10,434.60
5PRUEESP	PRUEBA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE LA CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PBA	521.73	20.00	10,434.60
TOTAL CAPITULO:					20,869.20



ALCALDÍA DE CHUNHUB
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

EL DIRECTOR DE OBRAS

CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V

EL SUPERVISOR

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO

TEC. LUIS O. MALDONADO ALAMILLA

C. GEYDEN O. HUCHAN CANUL

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA: REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CM. DE ESPESOR COMPACTO.					
LOCALIDAD: CHUNHUB, Q. ROO.					
CLAVE: No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS					
SRENIVEL	RENIVELACION DE PAVIMENTACION EXISTENTE, REALIZANDO ESCARIFICADO DE 12 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: RECARGUES CON MATERIAL DE BANCO DE BUENA CALIDAD CON 15 CM. DE ESPESOR Y PARTICULAS NO MAYORES A 7.5 CMS. PEPENA DE PARTICULAS NO ADECUADAS PARA LA SUBRASANTE APROVECHAMIENTO Y MEZCLADO DE MATERIAL ESCARIFICADO CON MATERIAL DE RECARGUE, BOMBEO DEL -2% HACIA LATERALES INCORPORACION DE AGUA, FORMACION Y COMPACTACION AL 95% COMO MININO Y MANO DE OBRA, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, PARA DAR PENDIENTE, MAQUINARIA Y EQUIPO. LIMPIEZA DE TALUDES Y HOMBROS (SIN DEJAR MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RECARGUE ETC.)	M2	82.18	4,217.60	346,602.37
	TOTAL CAPITULO:				346,602.37
	SUMA:				1,969,615.09
	16 % I.V.A.				315,138.42
	TOTAL:				2,284,753.51

EL DIRECTOR DE OBRAS

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO

CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V

TEC. LUIS D. MALDONADO ALAMILLA

EL SUPERVISOR

C. GEYDEN O. HUCHIN CANUL



**ALCALDÍA DE
CHUNHUB**
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018



TABLA COMPARATIVA DE AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CONTRATO			
OBRA	REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO	PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADO CONFORME A CONTRATO:	FECHA DE ELABORACION:
LOCALIDAD	CIRUNHUBUB, QUINTANA ROO	INICIO: 31 de julio de 2017	TERMINO: 28 de octubre de 2017
MUNICIPIO	FELIPE CARRILLO PUERTO	PERIODO DE EJECUCION DE FECHA DE INICIO REAL CONFORME PAGO DE ANTIPO:	
No CONTRATO	OP-FCP-FISINDIF17-IR-25/2017	DEL 10 de agosto de 2017	AL 7 de noviembre de 2017
OFICIO DE APROBACION	DIPM-FISINDIF17-FCP-018 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017	PERIODO DE EJECUCION DEFINITIVO BAJO CONVENIOS MODIFICATORIOS:	
No CEDULA	1V5312025	DEL AL	AL

No	CLAVE	DESCRIPCION	U/M	CANT	PRES. CONTRATADO		ADITIVAS (+)		DEDUCTIVAS (-)		PRES. FINAL		
					IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		CANT.	IMPORTE
0001	5RSTRE0	CAP. I.- PRELIMINARES. RASTREO, DESTROQUE, RETIRO DE MALEZA Y MATERIAL CONTAMINADO DE LOS LATERALES DE LA CALLE DEPOSITANDO EL MATERIAL HASTA 1 KILOMETRO FUERA DEL AREA DE TRABAJO. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2,100.00	\$ 9.49	\$ 19,925.00	0.00	\$ -	-325.60	-5	3,085.94	1,774.40	\$ 16,839.06
5BCH-FCP		BACHEO DENTRO DEL ANCHO DE CORONA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO DE 3.0 CMS. DE ESPESOR COMPACTO. INCLUYE: RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.3 LTM2, CAJEO, CALCE DEL BACHEO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y COMPACTACION A BASE DE RODILLO DE 1 TONELADA MINIMO.	M2	763.64	\$ 179.70	\$ 137,226.11	0.00	\$ -	-735.00	-5	132,079.50	28.64	\$ 5,146.61
0002	5BARR01	TOTAL CAP. I.- PRELIMINARES. CAP. II.- PAVIMENTACION. BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES TRABAJOS PREVIOS AL POREO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	HA	0.70	\$ 24,887.35	\$ 17,421.14	0.01	\$ 248.87	0.00	5	-	0.71	\$ 17,670.02
5PORE-01		POREO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE A CON GRANULOMETRIA DE 30" A FINOS. CON EMULSION SUPERPESTABLE A RAZON DE 1.1 LTM2. INCLUYE: FLETE DE MAQUINARIA, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MATERIALES.	M2	6,976.00	\$ 54.89	\$ 382,912.64	121.60	\$ 6,674.62	0.00	5	-	7,097.60	\$ 389,587.26
5PAVCA03		PAVIMENTACION DE 3.0 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE ELABORADO EN PLANTA CON UNA GRANULOMETRIA DE 30" A FINOS. APLICACION DE 1.0 LITRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROYALMENTO SUPERPESTABLE CATIONICA POR M2. TENDIDO CON PAVIMENTADORA Y COMPACTADO AL 95% DE SUP V S M. INCLUYE: FLETES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.	M2	6,540.00	\$ 176.27	\$ 1,157,805.80	114.00	\$ 20,094.78	0.00	5	-	6,654.00	\$ 1,172,900.58
TOTAL CAP. II.- PAVIMENTACION						\$ 1,553,139.58		\$ 27,018.27		\$ -			\$ 1,580,157.86

ELABORO:

Vo.Bo.:

REVISO:

Vo.Bo.:

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO
DIR. DE OBRAS PUB.

ALCALDIA DE CHUNHUBUB
MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018



TABLA COMPARATIVA DE AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CONTRATO

OBRA	PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADO CONFORME A CONTRATO:				FECHA DE ELABORACION:
LOCALIDAD	INICIO	31 de julio de 2017	TERMINO:	28 de octubre de 2017	
MUNICIPIO	PERIODO DE EJECUCION DE FECHA DE INICIO REAL CONFORME PAGO DE ANTICIPO:				
No CONTRATO	DEL	10 de agosto de 2017	AL	7 de noviembre de 2017	
OFICIO DE APROBACION	PERIODO DE EJECUCION DEFINITIVO BAJO CONVENIOS MODIFICATORIOS:				
No CEDULA	DEL	21/31/2025	AL		

No	CLAVE	DESCRIPCION	URI	CANT	PRES. CONTRATADO		ADITIVAS (+)		DEDUCTIVAS (-)		PRES. FINAL	
					PUNI	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
0003	SPRUE-02	CAP. III.- PRUEBAS DE LABORATORIO. PRUEBA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR EL GRADO DE PERMEABILIDAD EN LA CARPETA ASFALTICA APLICADA, INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PBA	20.00	\$ 511.73	\$ 10,434.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	20.00	\$ 10,434.60
0003	SPRUE-03	PRUEBA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE LA CARPETA ASFALTICA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PBA	20.00	\$ 511.73	\$ 10,434.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	20.00	\$ 10,434.60
0004	SPRUE-04	TOTAL CAP. III.- PRUEBAS DE LABORATORIO.				\$ 20,869.20						\$ 20,869.20
0004	SPRUE-05	CAP. IV.- EXTRAORDINARIOS. RENOVELACION DE PAVIMENTACION EXISTENTE, REALIZANDO ESCARIFICADO DE 12 CMS DE ESPESOR. PROMEDIO INCLUYE: RECARGUE CON MATERIAL DE BANCO DE BUENA CALIDAD CON 15 CMS. DE ESPESOR Y PARTICULAS NO MAYORES A 7.5 CMS PEPEÑA DE PARTICULAS NO ADECUADAS PARA LA SUBSANTANTE APROVECHAMIENTO Y MEZCLADO DEL MATERIAL ESCARIFICADO CON MATERIAL DE RECARGUE BOMBEADO DEL -2% HACIA LATERALES INCORPORACION DE AGUA, FORMACION Y COMPACTACION AL 95% COMO MINIMO Y MANO DE OBRA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA PARA DAR PENDIENTE MAQUINARIA Y EQUIPO. LIMPIEZA DE TALUDES Y HOMBROS SIN DEJAR MATERIAL PRODUCTO DE CORTE. RECARGUE ETC.)	MZ	0.00	\$ 82.18	\$ -	4,217.60	\$ 346,602.37	0.00	\$ -	4,217.60	\$ 346,602.37
		TOTAL CAP. IV.- EXTRAORDINARIOS.				\$ -						\$ -
		SUBTOTAL:				\$ 1,751,163.89		\$ 373,620.64		\$ -		\$ 1,969,615.10
		16.00% DE I.V.A.:				\$ 276,986.22		\$ 59,779.30		\$ -		\$ 315,138.41
		TOTAL PRESUPUESTO:				\$ 2,008,150.12		\$ 433,399.94		\$ -		\$ 2,284,753.51
		DIFERENCIA:				\$ -		\$ 239,451.21		\$ -		\$ -

ELABORADO:

REVISADO:

Vo.Bo.:

ING. FELIPE CABRERA BASTO
DIR. DE OBRAS PUB.

TEC. JOSE MIGUEL ACERO PALOMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

TEC. GUSTAVO MARTIN CABRIL
RESIDENTE DE OBRAS PUB.



TABLA COMPARATIVA DE AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CONTRATO

OBRA	PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADO CONFORME A CONTRATO:				FECHA DE ELABORACION:
LOCALIDAD	CHUNHUHUB, QUINTANA ROO	INICIO	31 de julio de 2017	TERMINO	28 de octubre de 2017
MUNICIPIO	FELIPE CARRILLO PUERTO	PERIODO DE EJECUCION DE FECHA DE INICIO REAL CONFORME PAGO DE ANTIICIPO:			
No CONTRATO	OP-FCP-FISHIDF17-IR-352017	DEL	10 de agosto de 2017	AL	7 de noviembre de 2017
OFICIO DE APROBACION	OPM-FISMDF17-FCP-018 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017	PERIODO DE EJECUCION DEFINITIVO BAJO CONVENIOS MODIFICATORIOS:			
No CEDULA	2V-5312025	DEL		AL	

No	CLAVE	DESCRIPCION	U/M	CANT	PRES. CONTRATADO		ADITIVAS (+)		DEDUCTIVAS (-)		PRES. FINAL	IMPORTE
					IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.		

RESUMEN GENERAL

PARTIDAS	IMPORTE	%	ADITIVAS (+)		DEDUCTIVAS (-)		%	PRES. FINAL
			IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.		
0001 CAP. I.- PRELIMINARES.	\$ 157,155.11	9.08%	\$ -	-	\$ -	0.00%	-7.81%	\$ 21,985.67
0002 CAP. II.- PAVIMENTACION.	\$ 1,553,139.58	89.73%	\$ 27,018.27	-	\$ -	1.56%	0.00%	\$ 1,580,157.86
0003 CAP. III.- PRUEBAS DE LABORATORIO.	\$ 20,869.30		\$ -	-	\$ -			\$ 20,869.30
0004 CAP. IV.- EXTRAORDINARIOS.	\$ -		\$ 346,602.37	-	\$ -			\$ 346,602.37
SUBTOTAL:			\$ 1,731,162.89	98.79%	\$ 373,620.64	1.56%	-7.81%	\$ 1,969,615.10
16.00% DE I.V.A.:			\$ 276,986.22		\$ 59,779.30			\$ 315,138.41
TOTAL PRESUPUESTO:			\$ 2,008,150.12		\$ 433,399.94			\$ 2,284,753.51

ELABORO:

Vo. Bo.:

TEC. LUIS OSWALDO MALDONADO ACANILLA
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

TEC. JOSE MIGUEL MORENO PALOMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

DIFERENCIA \$ 238,451.21



Vo. Bo.:

REVISO:

TEC. GEYSA PATRICIA CANUL
RESIDENTE DE OBRAS PUB.

ALCALDIA DE CHUNHUHUB
MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2016
ING. JEREMIAS CABRERA BASTO
DIR. DE OBRAS PUB.


CHUNHUHUB PLANO DEFINITIVO

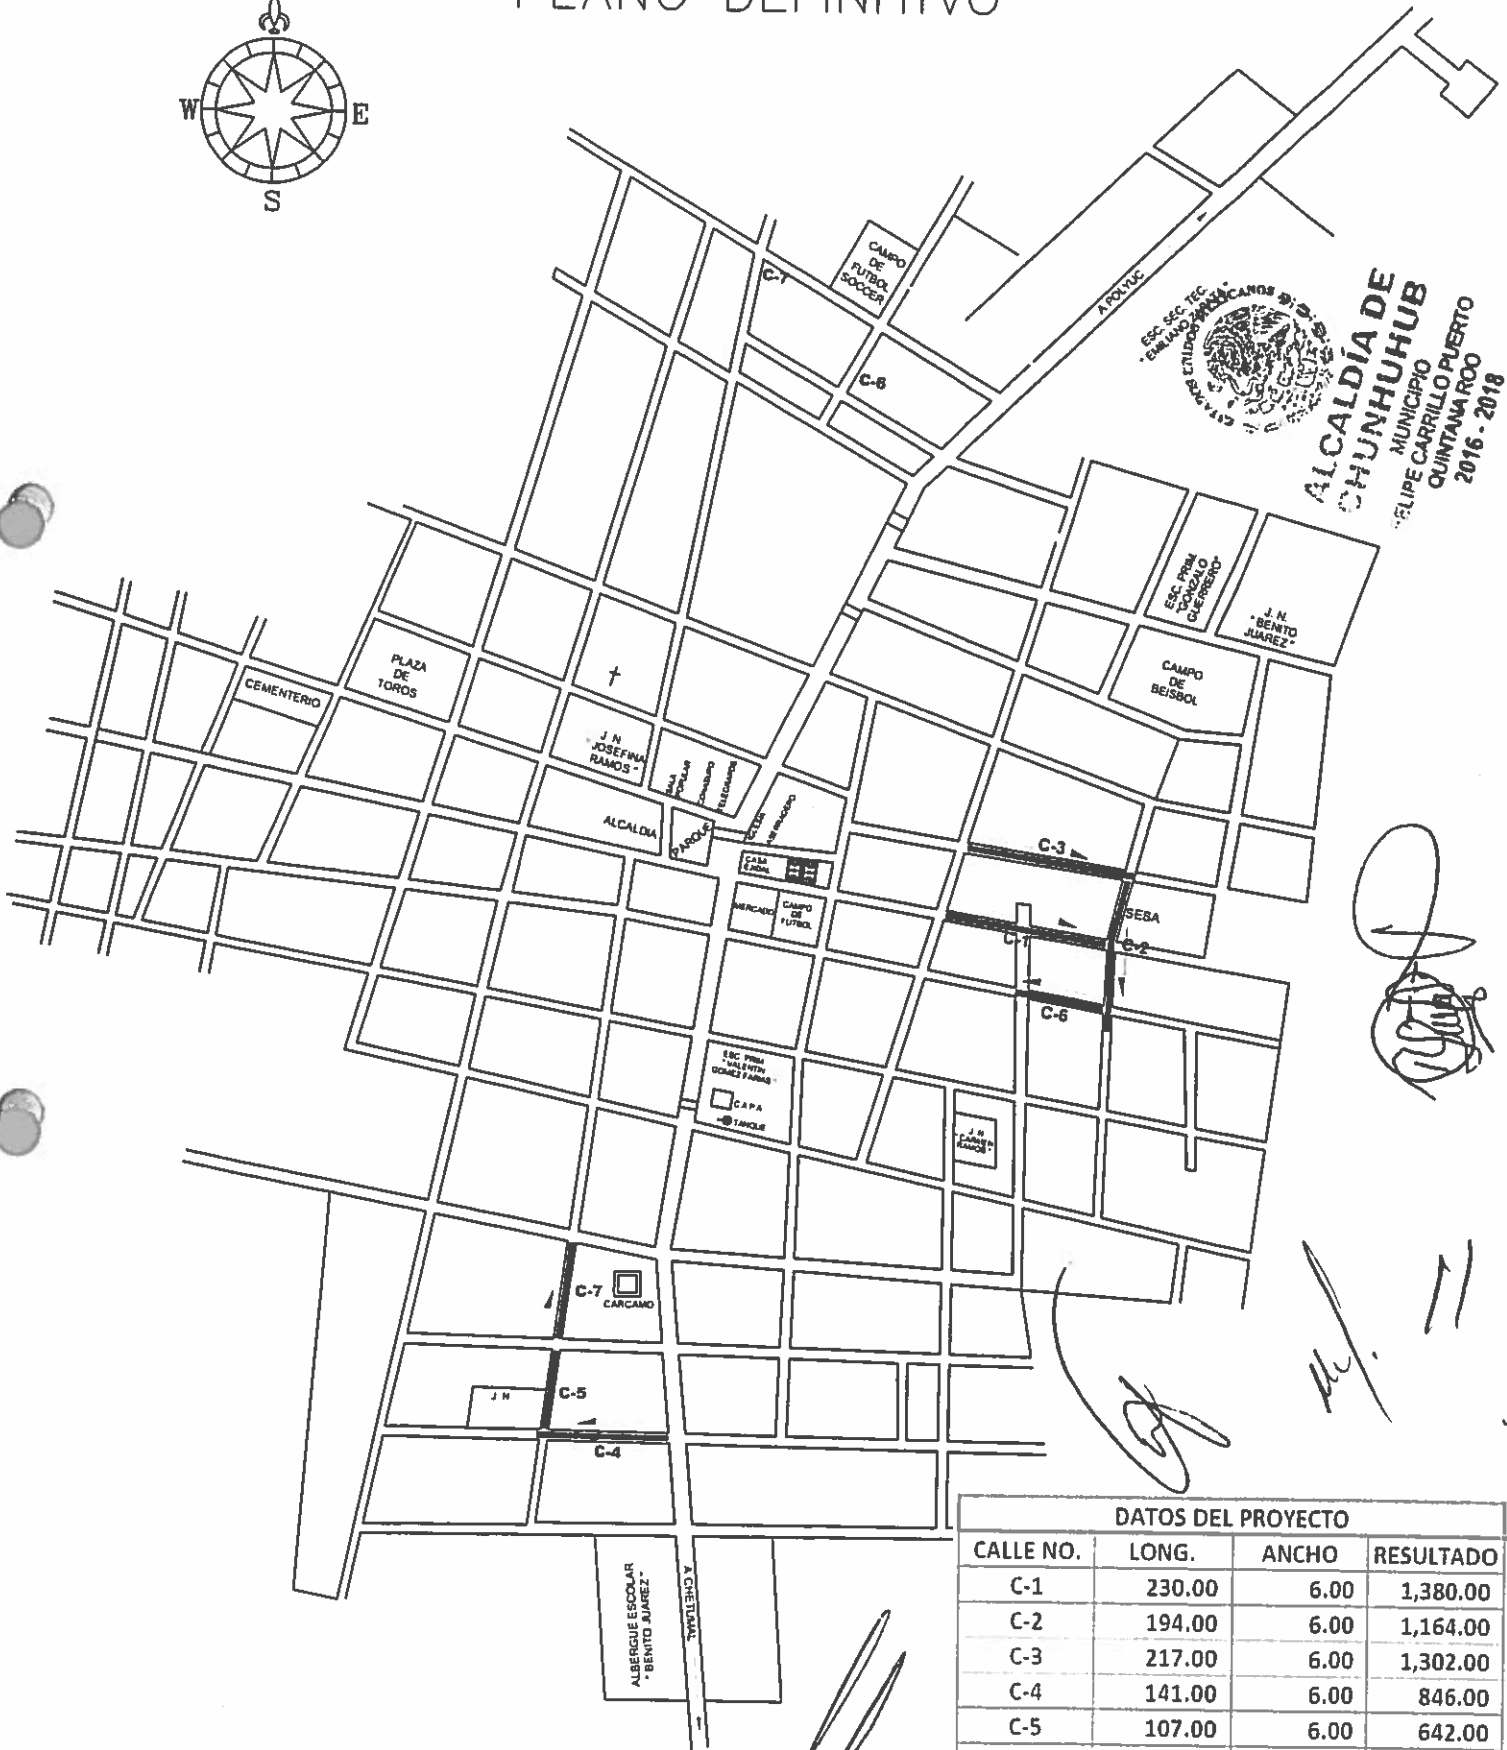

ALCALDIA DE CHUNHUHUB
MUNICIPIO
"ELIPE CARRILLO PUERTO"
QUINTANA ROO
2016 - 2018

DATOS DEL PROYECTO			
CALLE NO.	LONG.	ANCHO	RESULTADO
C-1	230.00	6.00	1,380.00
C-2	194.00	6.00	1,164.00
C-3	217.00	6.00	1,302.00
C-4	141.00	6.00	846.00
C-5	107.00	6.00	642.00
C-6	105.00	6.00	630.00
C-7	115.00	6.00	690.00
TOTAL:	1,109.00		6,654.00

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO



CHUNHUHUB




ALCALDÍA DE
CHUNHUHUB
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018
A CANCEL

Limite con Estado de Yucatan


MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

MUNICIPIO DE JOSE MA. MORELOS

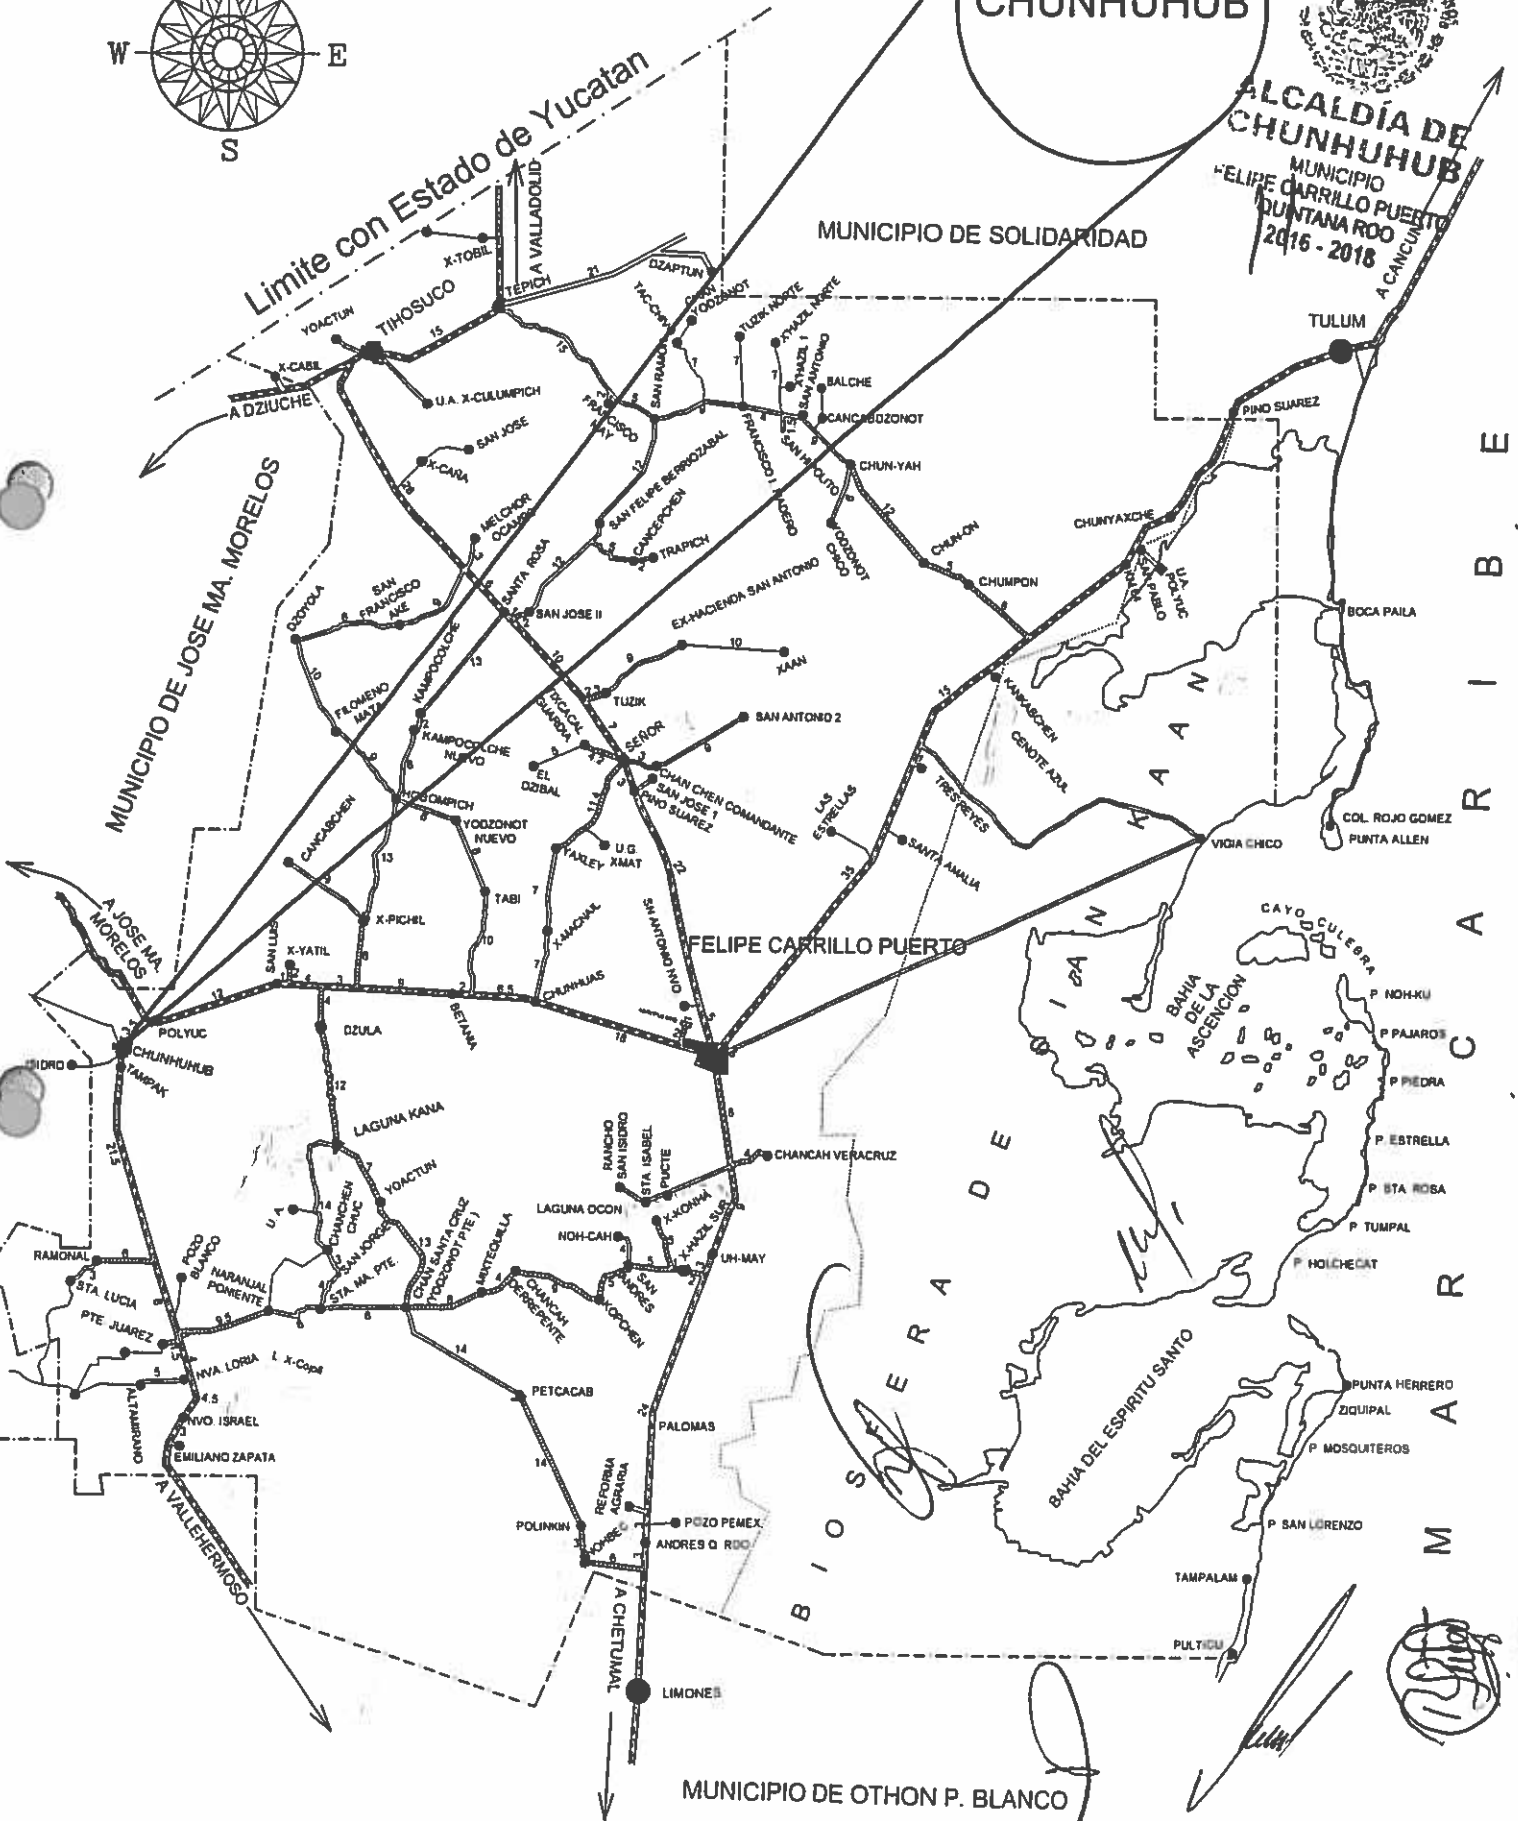


MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE QUINTANA ROO



CHUNHUHUB

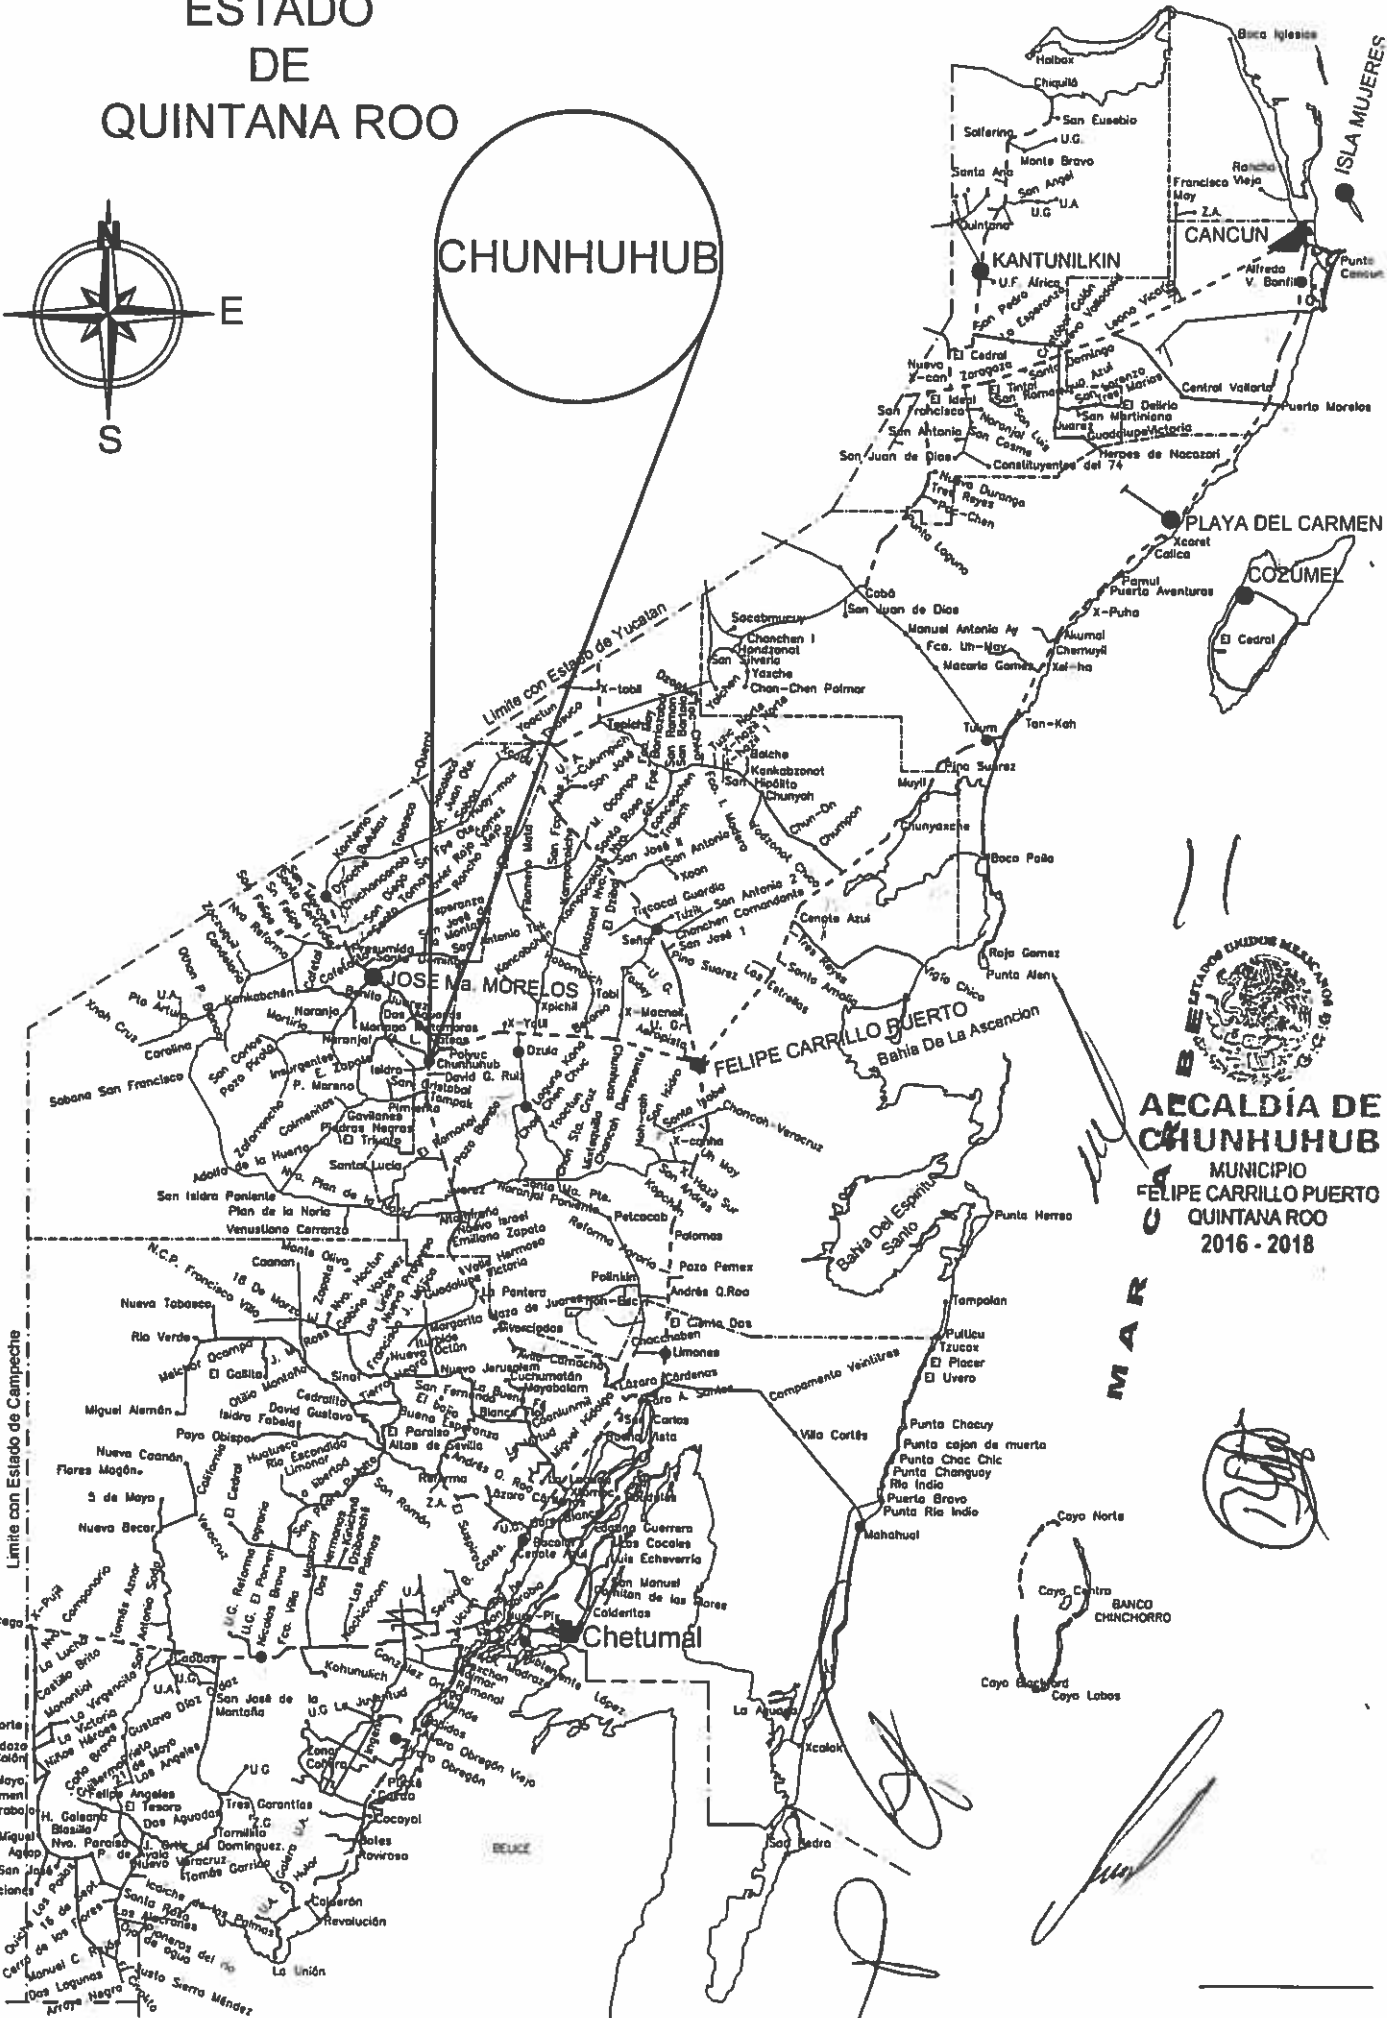

AYCALDÍA DE CHUNHUHUB
MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

MAR



POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

EXPEDICION			
28-11-2017			
ENDOSO			
0000			
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO DE FIANZA	INCLUSION
228,475.35	PESOS	1856206	0

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 228,475.35 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.

Por: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Ante: A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

ALCALDIA DE CHUNHUB
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016

AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., CONSTITUYE FIADORA POR LA CANTIDAD DE \$ 228,475.35 (SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.). ANTE: Y A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, PARA GARANTIZAR POR CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO FISCAL EN LA AVENIDA AARON MERINO FERNANDEZ NO. 106, COLONIA FORJADORES, C.P. 77025 CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚM. CMA960120L53, CONSTITUYE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN TÉRMINOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO OP-FCR-FISMDF17-IR-25/2017 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 Y CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO CM-01-OP-FCR-FISMDF17-IR-25 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2017, CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO, REPRESENTADO POR LA C.P. PAOLY ELIZABETH PERERA MALDONADO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE NUESTRO FIADOR CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL TCO. JOSE MIGUEL MORENO PALOMEQUE, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, RELATIVO A LA OBRA: REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE: CHUNHUB, QUINTANA ROO, CON CÉDULA NÚMERO 2V5312025., DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES MENCIONADAS EN EL CITADO CONTRATO CON SUS ANEXOS Y CONVENIO MODIFICATORIO. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 2,284,753.51 (SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO; LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO ANTES CITADO Y CONVENIO MODIFICATORIO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y CONVENIO MODIFICATORIO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO. B) QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO, SALVO QUE EXISTA INFORMIDAD DE EL MUNICIPIO, EN CUYO CASO LA VIGENCIA SE PRORROGARA HASTA LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A SATISFACCIÓN DE EL MUNICIPIO, C) LA FIANZA RESPONDE DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS; MATERIA DEL CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACIÓN DE EL MUNICIPIO. D) QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO. E) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 174, 178, 279, 280, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTICULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. F) NO SE CONSIDERARA NOVACIÓN LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Expedido en: OFICINA 00353, CHETUMAL, QUINTANA ROO

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

VERONICA LOZANO CARRILLO
LOCUT 74020317

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO. EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.acefianzasmonterrey.com



FIRMA DIGITAL


LINEA DE VALIDACION
0918 7DC6 1D

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTÍAS A.C. R.F.C. FMO930803PB) ACE Fianzas Monterrey, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

*En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0039-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.



Endosos

Fianza / endoso: 1856206 0 / 0000

Fecha de 28/11/2017

Expedición:

Fiado: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

Beneficiario: A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO QUINTANA ROO

Monto de la fianza: S228 475 35

Monto del movimiento: S228 475 35

Moneda: PESOS

Producto: OBRA - BUENA CALIDAD



ALCALDÍA DE
CHUNHUB
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación:

097658341516

