



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 parrafo 1 y 62 de la Ley de Obras Públicas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento, se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Cédula y Nombre de la Obra 2V5312033.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPE SOR COMPACTO. COLS. J. MARTINEZ ROSS, HUAYUMIL, J. BTA VEGA, C.CILIO L. VICARIO, E. ZAPATA, R. E. MELGAR Y PLAN DE AYALA.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: FELIPE CARRILLO PUERTO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio FISDMDF17

Siendo las 10:00 a.m. horas del día 22 del mes de NOVIEMBRE del año 2017

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. representada por la C. TEC. JOSE MIGUEL MORENO PALOMEQUE en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL; Acompañando por su superintendente el C. TEC. PEDRO LEOVIGILDO TUN MOO. la Dependencia Ejecutora representada por el ING. JEREMIAS CABRERA BASTO Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. TEC. LUIS A. PECH CAUICH, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en :

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 2V5312033 .- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3.0 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO MISMA QUE COMPRENDE EN RASTREO DE MALEZA,BACHEO,BARRIDO DE LA SUPERFICIE,POREO CON CARPETA ASFALTICA, PAVIMENTACION DE 3.0CMS DE ESPESOR COMPACTO CON UNA SUP. DE 13,296.28 M2, PRUEBAS DE PERMEABILIDAD Y DE ESPESORES, PASO PEATONAL A BASE DE CONCRETO ASEALTICO

Información contractual

No. De contrato: OP-FCP-FISDMDF17-LP-33/2017 Importe con IVA incluido: \$ 3,788,169.37

Garantía de anticipo: 1822413 Importe: \$ 1,136,450.82

Garantía de cumplimiento: 1822414 Importe: \$ 378,816.94

Fianza de vicios ocultos: 1857238 Importe: \$ 382,289.28

Fecha de inicio de contrato: 31 DE JULIO DE 2017 Fecha de inicio real: 10 DE AGOSTO DE 2017

Fecha de terminación de contrato: 28 DE OCTUBRE DE 2017 Fecha de terminación real: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio: CM-01-OP-FCP-FISDMDF17-LP-33/2017 Fecha de Convenio: 09 DE OCTUBRE DE 2017

Plazo de ejecución: DEL 10 DE AGOSTO DE 2017 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 Importe final contratado: \$ 3,822,892.76

SE MODIFICARON LOS VOLUMENES CONTRATADOS EN ADITIVAS Y DEDUCTIVAS Y COMO CONSECUENCIA LA DE NUEVOS CONCEPTOS CON CLAVES:5EXTPP01, 5EXTPP02, .

Numero de Estimacion	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes
No.- 1	\$ 1,714,693.27	
No.- 2	\$ 889,611.54	
No.- 3		\$ 825,062.05
No.- 4 (Finiquito)		\$ 393,525.90
Sumas	\$ 3,822,892.76	\$ 1,218,587.95
Inversión Ejercida	\$ 3,822,892.76	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**



En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatad	Municipal	Total
\$	\$	\$	\$

La empresa CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el 46 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS
S.A DE C.V

TEC. PEDRO LEOWIGLIG TUN MOO
Superintendente
Nombre y Firma

Recibe por la Ejecutora
Por la Direccion de Obras Publicas

TEC. LUIS A. PECH CAUICH
Residente de Obra
Nombre y Firma

Testigos

Por el Comité de Obra

C. VIANCA VIANEY ANTONIO TAX
Presidente del comité de obra
Nombre, Cargo y Firma

DIRECCION DE PLANEACION

Nombre, Cargo y Firma

Delegado de la localidad

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Supervisor de La Contraloria Municipal
Nombre, Cargo y Firma

Por la SEDESOL

Nombre, Cargo y Firma



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento

Ejecutor de de la Obra DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 2V5312033.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPE SOR COMPACTO COLS: J. MARTINEZ ROSS, HUAYUMIL, J. BTA VEGA, C.CILIO L VICARIO, E. ZAPATA, R. E MELGAR Y PLAN DE AYALA.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: FELIPE CARRILLO PUERTO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio FISMDF17

Siendo las 10:00 horas del día 22 del mes de Noviembre del año 2017; los representantes de las Entidades y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Direccion de Obras Publicas representada por el C. Tec. Luis a pech cauch en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra 2V5312033.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3.0 CMS. DE ESPESOR COMPACTO. a la Direccion de Obras Publicas representada por el C. TEC. SAMUEL CHUC EK en su carácter de sobrestante de conservacion y mantenimiento de calles y caminos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 2V5312033 .- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3.0 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO MISMA QUE COMPRENDE EN RASTREO DE MALEZA,BACHEO,BARRIDO DE LA SUPERFICIE,POREO CON CARPETA ASFALTICA, PAVIMENTACION DE 3.0CMS DE ESPESOR COMPACTO CON UNA SUP. DE 13,296.28 M2, PRUEBAS DE PERMEABILIDAD Y DE ESPESORES, PASO PEATONAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO.


EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construccion final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.


Leida la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcanza legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento


C. TEC. LUIS A. PECH CAUCH
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS
Nombre, Cargo y Firma


C. TEC. SAMUEL CHUC EK
SOBRESTANTE DE OBRAS PUBLICAS
conservacion y mantenimiento

Por la Normativa

Testigos

Por la DIR. DE PLANEACION


Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

Por la Oficialía Mayor

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA: REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CM. DE ESPESOR COMP/

LOCALIDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO. (COLONIAS: JESUS M. ROSS, HUAYUMIL, JUAN B. VEGA, CECILIO CHI, LEONA VICARIO, EMILIANO ZAPATA, RAFAEL E. MEGAR Y PLAN DE AYALA.

CLAVE: No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CAP. I.- PRELIMINARES					
5RASTREO	RASTREO, DESTRONQUE, RETIRO DE MALEZA Y MATERIAL CONTAMINADO DE LOS LATERALES DE LA CALLE DEPOSITANDO EL MATERIAL HASTA 1 KM FUERA DEL AREA DE TRABAJO INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 3,287.90	\$ 9.49	\$ 31,202.17
5BCH-FCP	BACHEO DENTRO DEL ANCHO DE CORONA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 3.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, INCLUYE: RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.3 LT/M2, CAJEO, CALCE DEL BACHE CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y COMPACTACION A BASE DE RODILLO DE 1 TONELADA MINIMO.	M2	\$ 304.87	\$ 179.71	\$ 54,788.19
TOTAL CAPITULO:					\$ 85,990.36
CAP. III.- PAVIMENTACION					
5BARR101	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, TRABAJOS PREVIOS AL POREO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	HA	\$ 1.40	\$ 24,887.70	\$ 34,842.78
5PORE-01	POREO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE A CON GRANULOMETRIA DE 3/8" A FINOS, CON EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 1.1 LT/M2, INCLUYE: FLETE DE MAQUINARIA, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MATERIALES.	M2	\$ 13,685.40	\$ 54.11	\$ 740,516.99
5PAVCA03	PAVIMENTACION DE 3.00 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE ELABORADO EN PLANTA CON UNA GRANULOMETRIA DE 3/8" A FINOS, APLICACION DE 1.00 LTS. DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO SUPERESTABLE CATIONICA POR M2, TENDIDO CON PAVIMENTADORA Y COMPACTADORA AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: FLETES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.	M2	\$ 13,296.28	\$ 171.95	\$ 2,286,295.35
TOTAL CAPITULO:					\$ 3,061,655.12
CAP. IV.- PRUEBAS DE LABORATORIO.					
5PRUE-02	PRUEBA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA PERMEABILIDAD EN LA CARPETA ASFALTICA APLICADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PBA	\$ 30.00	\$ 521.73	\$ 15,651.90
5PRUE-03	PRUEBA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE LA CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PBA	\$ 30.00	\$ 521.73	\$ 15,651.90
TOTAL CAPITULO:					\$ 31,303.80



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA: REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CM. DE ESPESOR COMP/

LOCALIDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO, Q ROO (COLONIAS: JESUS M. ROSS, HUAYUMIL, JUAN B. VEGA, CECILIO CHI, LEONA VICARIO, EMILIANO ZAPATA, RAFAEL E. MEGAR Y PLAN DE AYALA.

CLAVE: No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS					
5EXTPP01	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL DE 7.50X6.40 MTS. A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE ELABORADO EN PLANTA CON UNA GRANULOMETRÍA DE 3/8" A FINOS, APLICACIÓN DE 1 LITRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO SUPERESTABLE CATIONICA POR M2, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: DEMOLICION DE PASO PEATONAL EXISTENTE, FLETES DE MATERIAL, EQUIPOS, MAQUINARIA PESADA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	\$ 1.00	\$ 44,390.51	\$ 44,390.51
5EXTPP02	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL DE 12.00X5.50 MTS. A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE ELABORADO EN PLANTA CON UNA GRANULOMETRÍA DE 3/8" A FINOS, APLICACIÓN DE 1 LITRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO SUPERESTABLE CATIONICA POR M2, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: DEMOLICION DE PASO PEATONAL EXISTENTE, FLETES DE MATERIAL, EQUIPOS, MAQUINARIA PESADA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	\$ 1.00	\$ 72,257.42	\$ 72,257.42
	TOTAL CAPITULO:				\$ 116,647.93
	SUMA:				\$ 3,295,597.21
	16 % I.V.A.				\$ 527,295.55
	TOTAL:				\$ 3,822,892.76

REVISO

EL RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS
TEC. LUIS A. PECH CAUICH

Vº Bº


EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JEREMIAS CABRERA BASTO

LA EMPRESA CONSTRUCTORA

SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA
TEC. PEDRO LEOVIGILDO TUN MOO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

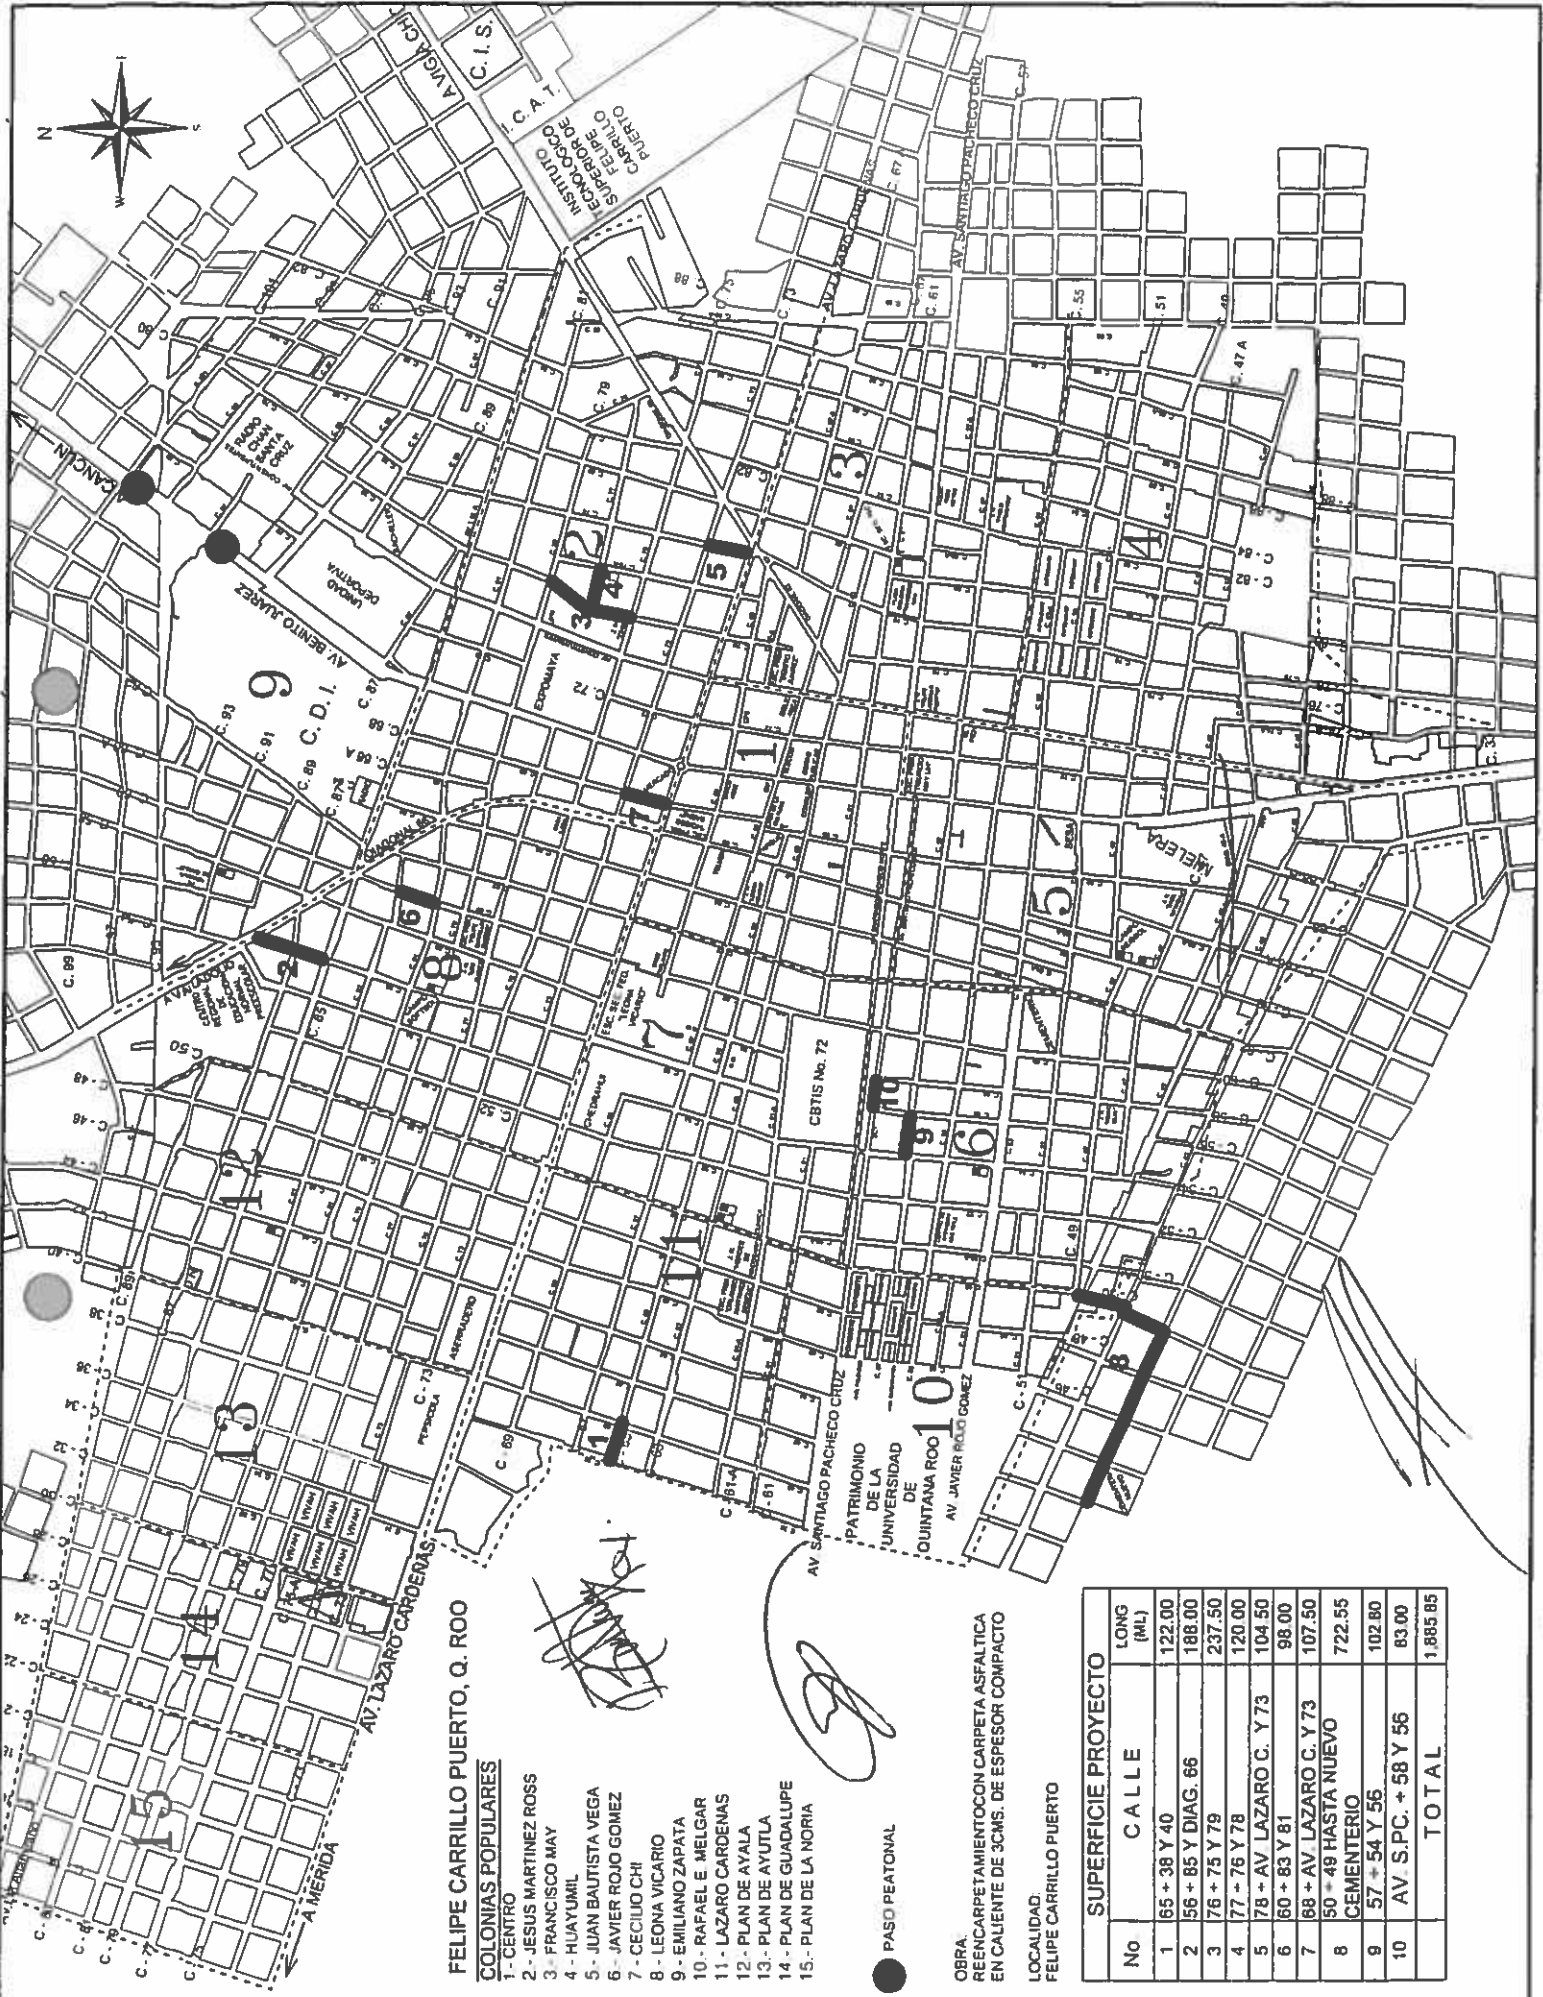

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

- COLONIAS POPULARES**
- 1.- CENTRO
 - 2.- JESUS MARTINEZ ROSS
 - 3.- FRANCISCO MAY
 - 4.- HUAYUMIL
 - 5.- JUAN BAUTISTA VEGA
 - 6.- JAVIER ROJO GOMEZ
 - 7.- CECILIO CHI
 - 8.- LEONA VICARIO
 - 9.- EMILIANO ZAPATA
 - 10.- RAFAEL E. MELGAR
 - 11.- LAZARO CARDENAS
 - 12.- PLAN DE AYALA
 - 13.- PLAN DE AYUTLA
 - 14.- PLAN DE GUADALUPE
 - 15.- PLAN DE LA NORIA

● PASO PEATONAL

OBRA.
RECARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA
EN CALIENTE DE 3CMS. DE ESPESOR COMPACTO

LOCALIDAD.
FELIPE CARRILLO PUERTO

SUPERFICIE PROYECTO		
No	CALLE	LONG (ML)
1	65 + 38 Y 40	122.00
2	56 + 85 Y DIAG. 66	188.00
3	76 + 75 Y 79	237.50
4	77 + 76 Y 78	120.00
5	78 + AV LAZARO C. Y 73	104.50
6	80 + 83 Y 81	98.00
7	88 + AV LAZARO C. Y 73	107.50
8	50 + 49 HASTA NUEVO CEMENTERIO	722.55
9	57 + 54 Y 56	102.80
10	AV. S.P.C. + 58 Y 56	83.00
TOTAL		1,885.85



CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

R.F.C. 046402033 CALLE 2471 - 955 629-2814
AV. ANTONIO DE SOTO #108 COL. LOS ACACOS TEL. (999) 554 0000

No LICITACION		FCP-OP-LP-32-2017		PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADO CONFORME A CONTRATO:		ANTICIPO	
DESCRIPCION		INICIO	TERMINO	PERIODO DE EJECUCION DE FECHA DE INICIO REAL CONFORME PAGO DE ANTICIPO:		FECHA PAGO DE ANTICIPO:	
LOCALIDAD		DEL	AL	PERIODO DE EJECUCION DEFINITIVO BAJO CONVENIOS MODIFICATORIOS:		FECHA	
M2		31 de julio de 2017	28 de octubre de 2017	7 de noviembre de 2017		10 de agosto de 2017	
M2		10 de agosto de 2017	AL	7 de noviembre de 2017			
M2		10 de agosto de 2017	AL	7 de noviembre de 2017			

No	CLAVE	DESCRIPCION	U/M	CANT	PRES. CONTRATADO		ADITIVAS (+)		DEDUCTIVAS (-)		PRES. FINAL			
					P.U.NI	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		CANT.	IMPORTE	
1	5SRASTREO	CAP. I.- PRELIMINARES: RASTREO, DESTROQUE, RETIRO DE MALEZA Y MATERIAL CONTAMINADO DE LOS LATERALES DE LA CALLE DEPOSITANDO EL MATERIAL HASTA 1 KILOMETRO FUERA DEL AREA DE TRABAJO. INCLUYE MAQUINARIA EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3,413.30	\$ 9.49	\$ 32,392.22	0.00	\$ -	-125.40	\$ 1,190.05	3,287.90	\$ 31,202.17	-125.40	\$ 1,190.05
2	5BCH-FCP	BACHEO DENTRO DEL ANCHO DE CORONA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 30 CMS DE ESPESOR COMPACTO. INCLUYE RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.3 LTM2, CAJEJO, CALCE DEL BACHEO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y COMPACTACION A BASE DE RODILLO DE 1 TONELADA MINIMO	M2	608.85	\$ 179.71	\$ 109,416.43	0.00	\$ -	-303.98	\$ 54,628.24	304.87	\$ 54,788.19	-303.98	\$ 54,628.24
				Total de CAP. I.- PRELIMINARES		\$ 141,808.65				\$ 55,818.29				\$ 85,990.36
3	5DESYSREC	CAP. II.- AGUA POTABLE: DESMANTELAMIENTO Y RECONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE POLIDUCTO EN TODO LO ANCHO DE LA SUBRA-SANTE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	TMA	7.00	\$ 378.71	\$ 2,650.97	0.00	\$ -	-7.00	\$ 2,650.97	0.00	\$ -	-7.00	\$ 2,650.97
				Total de CAP. II.- AGUA POTABLE		\$ 2,650.97				\$ 2,650.97				\$ 2,650.97
4	5BARR#1	CAP. III.- PAVIMENTACION: BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES TRABAJOS PREVIOS AL POREO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	HA	1.35	\$ 24,887.70	\$ 33,598.40	0.05	\$ 1,244.38	0.00	\$ -	1.40	\$ 34,842.78	0.05	\$ 1,244.38
5	5SPORE-01	POREO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE A CON GRANULOMETRIA DE 3/8" A FINOS CON EMULSION SU. PERESTABLE A RAZON DE 1.1 LTM2. INCLUYE FLETE DE MAQUINARIA, DESPERDICIOS EQUIPO Y MATERIALES	M2	13,529.10	\$ 54.11	\$ 732,059.60	156.30	\$ 8,457.39	0.00	\$ -	13,685.40	\$ 740,516.99	156.30	\$ 8,457.39
6	5PAVCA03	PAVIMENTACION DE 30 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE ELABORADO EN PLANTA CON UNA GRANULOMETRIA DE 3/8" A FINOS. APLICACION DE 1.0 LTS DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO SUPERESTABLE CATIONICA POR M2. TENDIDO CON PAVIMENTADORA Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE FLETES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA	M2	13,529.10	\$ 171.95	\$ 2,325,328.75	0.00	\$ -	-232.82	\$ 40,033.40	13,296.28	\$ 2,286,295.35	-232.82	\$ 40,033.40
				Total de CAP. III.- PAVIMENTACION		\$ 3,091,986.75				\$ 40,033.40				\$ 3,061,655.12

ELABORO:

REVISO:

Vo Bo:

Vo Bo:

TEC. JOSE MIGUEL MORENO PALOMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

1 DE 2



TABLA COMPARATIVA DE AUTORIZACION DE CONCEPTOS Y VOLUMENES FUERA DE CONTRATO

No LICITACION: FCP-OP-UP-32-2017		PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADO CONFORME A CONTRATO:		ANTICIPO: \$1,136,450.82	
DESCRIPCION: PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR EL GRADO DE HERRAMIENTA EN LA CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		TERMINO: 28 de octubre de 2017		FECHA PAGO DE ANTICIPO: 10 de agosto de 2017	
LOCALIDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO		MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO			
No CONTRATO: OP-FCP-FISMDFI-7ALP-332017		DEL: 10 de agosto de 2017		AL: 7 de noviembre de 2017	
OFICIO DE APROBACION: DPM-FISMDFI-7-FCP-033		PERIODO DE EJECUCION DEFINITIVO BAJO CONVENIOS MODIFICATORIOS:			
No CEDULA: 2V-512033		DEL: 10 de agosto de 2017		AL: 7 de noviembre de 2017	

No	CLAVE	DESCRIPCION	L/M	CANT	PRES. CONTRATADO		ADITIVAS (+)		DEDUCTIVAS (-)		PRES. FINAL				
					PUNI	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		CANT.	IMPORTE		
7	5PRUE-02	PRUEBA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR EL GRADO DE HERRAMIENTA EN LA CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PBA	28.00	\$ 521.73	\$ 14,608.44	2.00	\$ 1,043.46	0.00	\$ -	30.00	\$ 15,651.90	2.00	\$ 1,043.46	
8	5PRUE-03	PRUEBA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR EL ESPE-SOR DE LA CARPETA ASFALTICA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total de CAP. IV.- PRUEBAS DE LABORATORIO. =====>	PBA	28.00	\$ 521.73	\$ 14,608.44	2.00	\$ 1,043.46	0.00	\$ -	30.00	\$ 15,651.90	2.00	\$ 1,043.46	
9	5EXTPP01	CAP. V.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL DE 7.50 x 5.50 M. A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE ELABORADO EN PLANTA CON UNA GRANULOMETRIA DE 3/8" A FINOS. APLICACION DE 1 LT DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPI-MIENTO SUPERESTABLE CATIONICA POR M2 COMPACTA-DO AL 95% DE SU PVSIM INCLUYE DEMOLICION DE PASO PEATONAL EXISTENTE, FLETES DE MATERIAL, EQUIPOS, MAQUINARIA PESADA Y MANO DE OBRA	PZA	0.00	\$ 44,390.51	\$ -	1.00	\$ 44,390.51	0.00	\$ -	1.00	\$ 44,390.51	1.00	\$ 44,390.51	
10	5EXTPP02	CAP. V.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. =====> CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL DE 12.00 x 5.50 M. A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE ELABORADO EN PLANTA CON UNA GRANULOMETRIA DE 3/8" A FINOS. APLICACION DE 1 LT DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPI-MIENTO SUPERESTABLE CATIONICA POR M2 COMPACTA-DO AL 95% DE SU PVSIM INCLUYE DEMOLICION DE PASO PEATONAL EXISTENTE, FLETES DE MATERIAL, EQUIPOS, MAQUINARIA PESADA Y MANO DE OBRA. Total de CAP. V.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. =====>	PZA	0.00	\$ 72,257.42	\$ -	1.00	\$ 72,257.42	0.00	\$ -	1.00	\$ 72,257.42	1.00	\$ 72,257.42	
				SUBTOTAL =====>											
				15 IVA =====>											
				TOTAL =====>											

RESUMEN GENERAL															
CONTRATADO															
0001	CAP. I.- PRELIMINARES.														
0002	CAP. II.- AGUA POTABLE.														
0003	CAP. III.- PAVIMENTACION.														
0004	CAP. IV.- PRUEBAS DE LABORATORIO.														
0005	CAP. V.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS														
SUBTOTAL															
16.00% DE IVA															
TOTAL PRESUPUESTO:															

ELABORO:

REVISO:

TEC JOSE ANGEL MORENO PALOMEQUE
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
 CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO				EXPEDICION
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	22-11-2017
382,289.28	PESOS	1857238	0	ENDOSO
				0000

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 382,289.28 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.

Por: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Ante: A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO.
FIN DE TEXTO

Expedido en: OFICINA: 00353; CHETUMAL, QUINTANA ROO

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

VERONICA HOZANO CARRILLO
LOCV740208P1

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE BUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS.



FIRMA DIGITAL

Url: aCHe-VX26Bf-pArCPz24VOC-mALJS-DmZdZHoYh-38eP-eHrU-piUR-sdMmB-TM-Aq-DRS-SdthwVcK-Cap-Pack/7R27Ez-ZhE-Ce-TTYS8b88WYGN5EGzHwZ-wWwKXWfMdsYVvZwDosTseRk3YIq8rH
D8c8pnyPZ8R5Y-f800fscmr dMTOVSRGubentefHd0a87-ndVz8T1-Zh8e8ZGZyMezrVAG-5Z5L5N-4BL5Tf6rTqYmM88RC-8Y484J7WRwKd7t4F-5LZDYNJ7DdMmKv185L-ScIse-4Ud0p-C0e69K-==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTIAS, A.C.
R.F.C. FMO930803PB1 ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.acefianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0918 80D4 ED



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.
