



**Honorable Ayuntamiento de
Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.
2016 – 2018
Dirección de Obras Públicas.**



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, siendo las 14:00 hrs. Del día 22 de Diciembre de 2017, se reunieron el **C. GEYDEN HUCHIN CANUL**, Supervisor de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto y el **C. ELBERT RENE VEGA AYALA** en su carácter de Propietario de la empresa ELBERT RENE VEGA AYALA con la finalidad de llevar a cabo el finiquito de los trabajos realizados en la obra: **2V5312019.- CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE X-YATIL, Q. ROO;** al amparo del contrato **No. OP-FCP-FISMDF17-IR-19/2017**, de fecha 24 DE JULIO DE 2017.

I.- Descripción de los trabajos:

CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE con una superficie total de 6,780.00.00 metros cuadrados.

II.- Importe contractual y real del contrato:

Importe contractual: \$ 1,986,583.44

Importe Ampliado de Recursos: \$ 2,104.88

Monto Real: \$ 1,988,688.32



III.-Periodo de ejecución de los trabajos:

Contrato: Inicio: **31 DE JULIO DE 2017** Término: **28 DE OCTUBRE DE 2017.**

Real: Inicio: **10 DE AGOSTO DE 2017** Término: **27 DE NOVIEMBRE DE 2017.**

Fecha del Acta de Entrega-Recepción: **18 DE DICIEMBRE DE 2017**

IV.-Relación de las estimaciones pagadas:

No. de estimación	Periodo de Estimación	Importe de estimación
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL 10 DE AGOSTO DE 2017 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$ 650,693.87
ESTIMACION 2 (DOS)	DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 08 DE OCTUBRE DE 2017	\$ 676,903.85
ESTIMACION 3 (TRES)	DEL 09 DE OCTUBRE DE 2017 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	\$ 115,229.98

Crédito a favor de la empresa: \$ 0.00

Crédito a favor de la Dependencia: \$ 0.00

(Estas firmas corresponden al Acta Administrativa de Finiquito celebrada entre el Municipio de Felipe Carrillo Puerto y la empresa ELBERT RENE VEGA AYALA. de fecha 22 de Diciembre de 2017, cuyo objeto es finiquitar el contrato N° OP-FCP-FISMDF17-IR-19/2017 correspondiente al ejercicio fiscal 2017).



**Honorable Ayuntamiento de
Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.
2016 – 2018
Dirección de Obras Públicas.**



V.-Datos de la estimación final:


ESTIMACION 4 CUATRO (ULTIMA Y FINIQUITO)	DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017	\$ 127,890.92
---	---	---------------

VI.- Declaraciones:

- 1.- La contratante acepta que adeuda al contratista, el importe registrado en la fracción "V" del presente documento, y se compromete a realizar las gestiones necesarias para su pago.
- 2.- El contratista acepta como único adeudo a su favor, el importe registrado en la fracción "V" del presente finiquito, y se compromete a no exigir pagos adicionales posteriormente.

VII.- Garantía de Vicios Ocultos:

Al momento de la Firma de esta Acta, se cuenta con la Garantía de Vicios Ocultos, debido a que la obra asentada en esta Acta forma parte de un contrato de obra, dicha Garantía se entregó al momento de la Recepción Física de la obra, fecha en la cual iniciará el período de un año por vicios ocultos.

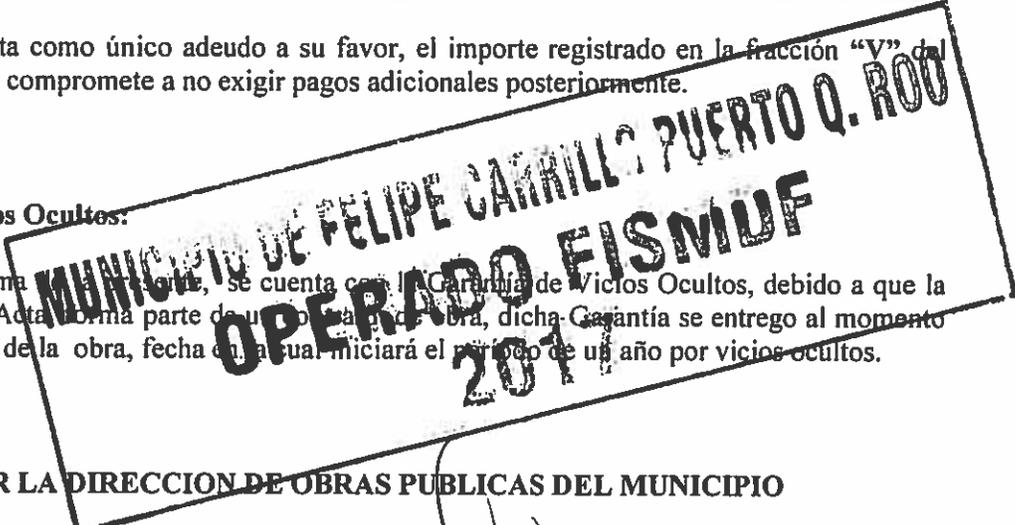

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO

C. TEC. GEYDEN HUICHIN CANUL
RESIDENTE DE OBRA

**POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
ELBERT RENE VEGA AYALA.**

C. ELBERT RENE VEGA AYALA
PROPIETARIO

(Estas firmas corresponden al Acta Administrativa de Finiquito celebrada entre el Municipio de Felipe Carrillo Puerto y la empresa ELBERT RENE VEGA AYALA. de fecha 22 de Diciembre de 2017, cuyo objeto es finiquitar el contrato N° OP-FCP-FISMDF17-IR-19/2017 correspondiente al ejercicio fiscal 2017).
