



002930



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA POR CONTRATO

OBRA:

2IV2126036.-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS CECILIO CHI, FRANCISCO MAY, JESUS MARTINEZ ROSS, PLAN DE AYUTLA Y EMILIANO ZAPATA I.

LOCALIDAD:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

INVERSION:

CONTENIDO



Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas S.A DE C.V.

CONTRATADO
\$ 9,670,965.04

EJECUTADO
\$ 12,252,960.18

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PRESUPUESTO DEFINITIVO
TABLA COMPARATIVA
PLANOS DEFINITIVOS
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Evelio Cruz B.

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO; 09 DE FEBRERO DE 2018



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2IV2126036

002929



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 2IV2126036.-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS CECILIO CHI, FRANCISCO MAY, JESUS MARTINEZ ROSS, PLAN DE AYUTLA Y EMILIANO ZAPATA I.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: FELIPE CARRILLO PUERTO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio RAMO 33.- FAISM

Siendo las 09:00 horas del día 9 del mes de FEBRERO del año 2018

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas S.A DE C.V. representada por el C. C.P. Angel Gustavo Flores Franco en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA acompañado en este acto por el superintendente de obra, C. Ing. Pedro Juventino Chiclin Kao; la Dependencia Ejecutora representada por el C. ING. JEREMIAS CABREJA, Jefe de la Dependencia de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. ALDRIN A. ARCEO ARCEO, quienes reciben a satisfacción los trabajos contratados en:

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA SUBTERRANEA CON CABLE DE POTENCIA X.P. CAL 3/0 AWG Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR TRIPLEX 400 MCM TS/MS/AL, MAC (2 X 3/0-1X1/0) Y CABLES LINEAS SUBTERRANEAS; LINEA AEREA CON POSTES PC-12-750 CON CONDUCTOR DE MEDIA TENSION SEMIAISLADO Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR NEUTRANEL; ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES DE CONCRETO CON SUS RESPECTIVAS LUMINARIAS TIPO D15, TRAMITE PARA LA CONTRATACION Y ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA CFE.

Información contractual

No. De contrato: OP-FCP-FISMDF17-LP-39/2017 Importe con IVA incluido: \$ 9,670,965.04
Garantía de anticipo: 2120729 Importe: \$ 2,901,289.51
Garantía de cumplimiento: 2120752 Importe: \$ 967,096.50
Fianza de vicios ocultos: 2176988 Importe: \$ 1,225,296.02

PERIODO DE CONTRATO

Fecha de inicio de contrato: 28 DE AGOSTO 2017
Fecha de terminación de contrato: 25 DE DICIEMBRE 2017

PERIODO REAL

Fecha de inicio real: 04 DE SEPTIEMBRE 2017
Fecha de terminación real: 30 DE DICIEMBRE 2017

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio: CM-01-OP-FCP-FISMDF17-LP-39/2017 Fecha de Convenio: 01 DE DICIEMBRE 2017
Plazo de ejecución: 118 DIAS Importe final contratado: \$ 12,252,960.18

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (Uno)	\$ 2,980,097.14	
2 (dos)	\$ 3,273,213.33	
3 (tres)	\$ 1,883,141.12	
4 (cuatro)		\$ 1,952,777.78
5 (cinco, última y finiquito)		\$ 2,163,730.81
Sumas	\$ 8,136,451.59	\$ 4,116,508.59
Inversión Ejercida	\$ 12,252,960.18	

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2IV2126036

002920




En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatad	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

La empresa Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas S.A DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

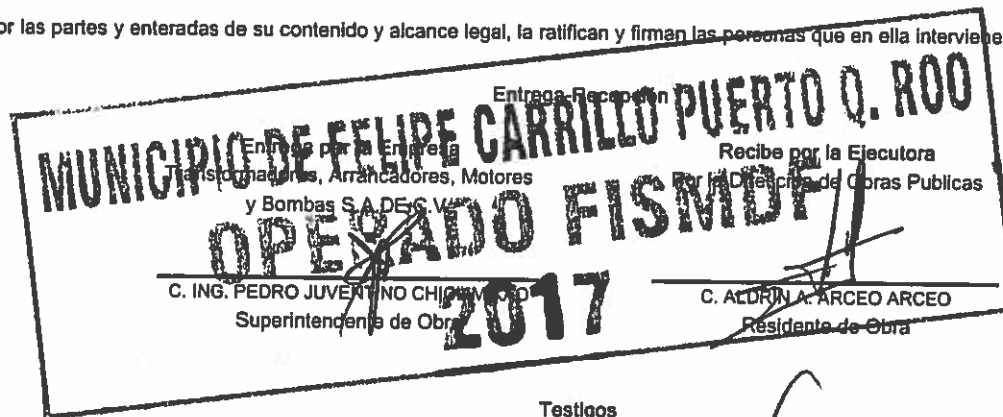

Por el Comité de Obra

Testigos

Por el Órgano de Control

C. EVELIO CRUZ ROSADO
Presidente del Comité

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Supervisor de La Contraloría Municipal



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

002927



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, artículo 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra

21V2126036.-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS CECILIO CHI, FRANCISCO MAY, JESUS MARTINEZ ROSS, PLAN DE AYUTLA Y EMILIANO ZAPATA I.

Municipio:

FELIPE CARRILLO PUERTO

Localidad:

FELIPE CARRILLO PUERTO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()

Fondo o Convenio

RAMO 33.- FAISM

Siendo las 09:00 horas del día 09 del mes de FEBRERO del año 2018; los representantes de las Entidades Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Direccion de Obras Publicas representada por el C. ALDRIN A. ARCEO ARCEO en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento del alumbrado publico de la obra Ampliación de Red de Energía Eléctrica, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo a la Direccion de Alumbrado Público representada por el C. WILLIAM A. MAY BACAB en su carácter de RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA SUBTERRANEA CON RED DE MEDIA TENSION CON CABLE DE POTENCIA XLP. CAL 3/0 AWG Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR TRIPLEX 600 VOLTS, XLP, DRS, AAC (2 X 3/0-1X1/0) AWG PARA LINEAS SUBTERRANEAS; LINEA AEREA CON POSTES PC-12-750 CON CONDUCTOR EN MEDIA TENSION SEMIAISLADO Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR NEUTRANEL; ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES DE CONCRETO CON SUS RESPECTIVAS LUMINARIAS TIPO OV15, TRAMITES PARA LA CONTRATACION Y ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA CFE.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara, que hace entrega de los planos, documentos, a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por los partes y enteradas de su contenido y alcance, legadas notificaciones a las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

C. ALDRIN A. ARCEO ARCEO
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

C. WILLIAM MAY BACAB
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO

Por el Órgano de Control

Testigos

Por el Comité de Obra

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MPAL

C. EVELIO CRUZ ROSADO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Por la empresa

C. ING. PEDRO JUVENILINO CHICLIM KAO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
