

001572



**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	2IV2126047.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	COLONIA:	JUAN BAUTISTA VEGA
Origen del Recurso:	Estatad () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	RAMO 33.- FISDMF
Siendo las	10:00 a.m.	horas del día	16 del mes de MARZO del año 2018
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa JOSE MANUEL BARRERA PERERA representada por el ING. JOSE MANUEL BARRERA PERERA, en su caracter de PROPIETARIO acompañado en este acto por el superintendente, ING. GASPAR SUAREZ GONDE; la Dependencia Ejecutora representada por el ING. JEREMIAS CABRERA BASTO, Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obras ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistientes en : CAPITULO I: PRELIMINARES, CAPITULO II: POSTES, CAPITULO III: ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, CAPITULO IV: ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, CAPITULO V: RETENIDAS, CAPITULO VI: CONDUCTORES, CAPITULO VII: ALUMBRADO PUBLICO, CAPITULO VIII: TRANSFORMADOR, CAPITULO IX: TRAMITES Y LIBRANZA Y CAPITULO X: CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.			
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN UNA AEREA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PUNTEO CON TRANSFORMADORES DE 25 KVA CON CONDUCTOR EN MEDIA TENSION SEMIAISLADO Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR NEUTRANAL DE 1/2" MANEJABLES SE INSTALARAN LUMINARIAS TIPO OV15, ACOMETIDAS AEREAS, TRAMITES PARA LA CONTRATACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EN LA PARTE SUBTERRANEA CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS, TRANSFORMADORES TIPO PERESTAL, REGISTROS RBTB2, REGISTROS RMTB3 POSTES DE 9 METROS Y CON SUS LUMINARIAS.			
Información contractual			
No. De contrato:	OP-FCF-FISDMF17-LP-49/2017	Importe con IVA incluido:	\$ 4,640,696.22
Garantía de anticipo:	2133032	Importe:	\$ 1,392,208.87
Garantía de cumplimiento:	2133034	Importe:	\$ 464,069.62
Fianza de vicios ocultos:	2187301	Importe:	\$ 538,492.05
Fecha de inicio de contrato:	02 DE OCTUBRE DE 2017	Fecha de inicio real:	13 DE OCTUBRE DE 2017
Fecha de terminación de contrato:	30 DE DICIEMBRE DE 2017	Fecha de terminación real:	30 DE DICIEMBRE DE 2017
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCF-FISDMF17-LP-49/2017	Fecha de Convenio:	01/12/2017
Plazo de ejecución:	79 DIAS	Importe final contratado:	\$ 5,384,920.51



**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**




Estimaciones

Número de Estimación	Importe de los Pagadas	Importe de los Pendientes de Pago
1	\$ 713,954.78	
2	\$ 3,675,278.01	
3 (FINIQUITO)		\$ 995,687.72
Sumas	\$ 4,389,232.79	\$ 995,687.72
Inversión Ejercida	\$ 5,384,920.51	

la empresa **JOSE MANUEL BARRERA PERERA** y la **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que pudiesen surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o Delegación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

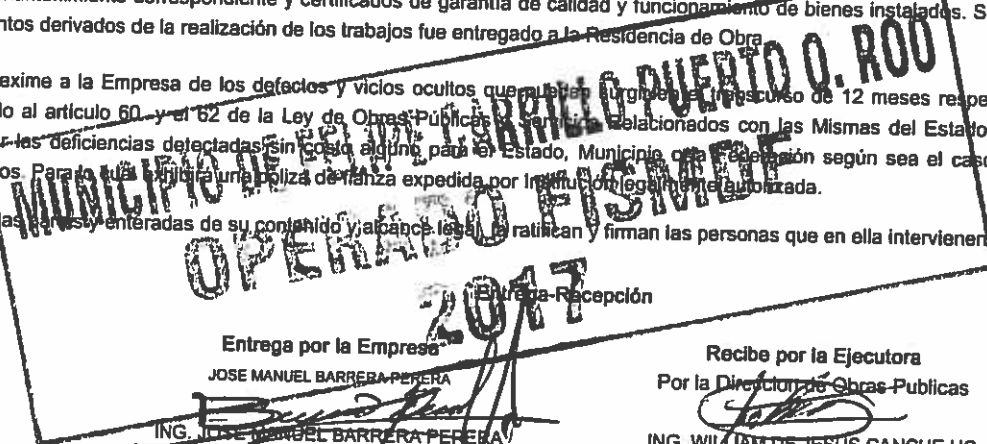

Entrega por la Empresa

JOSE MANUEL BARRERA PERERA

ING. JOSE MANUEL BARRERA PERERA

PROPIETARIO

Nombre y Firma

Recibe por la Ejecutora

Por la Dirección de Obras Públicas

ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC

Residente de Obras

Nombre y Firma

Por el Comité de Obra

Testigos

Por el Comité de Obra

Presidente del comité de obra

Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

**Por la Normativa
Conservación y Mantenimiento**

ING. RAUL MOREZ PERAZA

Contraloría Municipal

Nombre, Cargo y Firma

**TEC. WILLIAM A. MAY BACAB
Director de Alumbrado Publico**



**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, artículo 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra

2IV2126047.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: JUAN BAUTISTA VEGA

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()

Fondo o Convenio RAMO 33.- FISMDF

Siendo las 10:00 A.M. horas del día 16 del mes de MARZO del año 2018; los representantes de las Entidades y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Direccion de Obras Publicas representada por el ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA a la Direccion de Obras Publicas representada por el TEC. WILLIAM MAY BACAB en su carácter de director de alumbrado publico.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA AEREA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PC-12-750 CON TRANSFORMADORES DE 25 KVA, CON CONDUCTOR EN MEDIA TENSION EN AISLADO Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR NEUTRANEL, DE IGUAL MANERA SE INSTALARAN LUMINARIAS TPO 100 WATT. SE INICIARON LOS TRAMITES PARA LA CONTRATACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara que hace entrega de los partes correspondientes a la construccion final así como los manuales de operación y mantenimiento correspondientes y garantiza la garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y enterados de su contenido y alcance legal, se ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC

RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

Nombre, Cargo y Firma

TEC. WILLIAM A. MAY BACAB

DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO

conservacion y mantenimiento

Testigos

Por el Comité de Obra

Por el Comité de Obra

comité de obra

Nombre, Cargo y Firma

comité de obra

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

Por el superintendente de obra

SUPERVISOR DE LA CONTRATATORIA MUNICIPAL

Nombre, Cargo y Firma

ING. GASPAR SUAREZ CONDE

Nombre, Cargo y Firma
