



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PUBLICA
OBRA POR CONTRATO
21V2119002**



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Cédula y Nombre de la Obra: 21V2119002.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA.


Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO Localidad: FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

Origen del Recurso: E estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo de Convenio: RAMO 33.- FISMDF18

Siendo las 12:30 horas del día 31 del mes de AGOSTO del año 2018

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa: SERVICIOS DE INGERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V. representada por el C. ING. EDGAR GILBERTO BUENFIL GONZALEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO acompañado en este acto por el superintendente de obra, C. ING. DANIEL ORLADO TUN TUZ; la Dependencia Ejecutora representada por el TEC. LUIS ALBERTO PEOR CAUICH, Encargado de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. SEBASTIAN CAN PECH, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:

LOS CAPITULOS DE OBRAS: CAPITULO I.- CUBIERTA CAPITULO II.- INSTALACION ELECTRICA

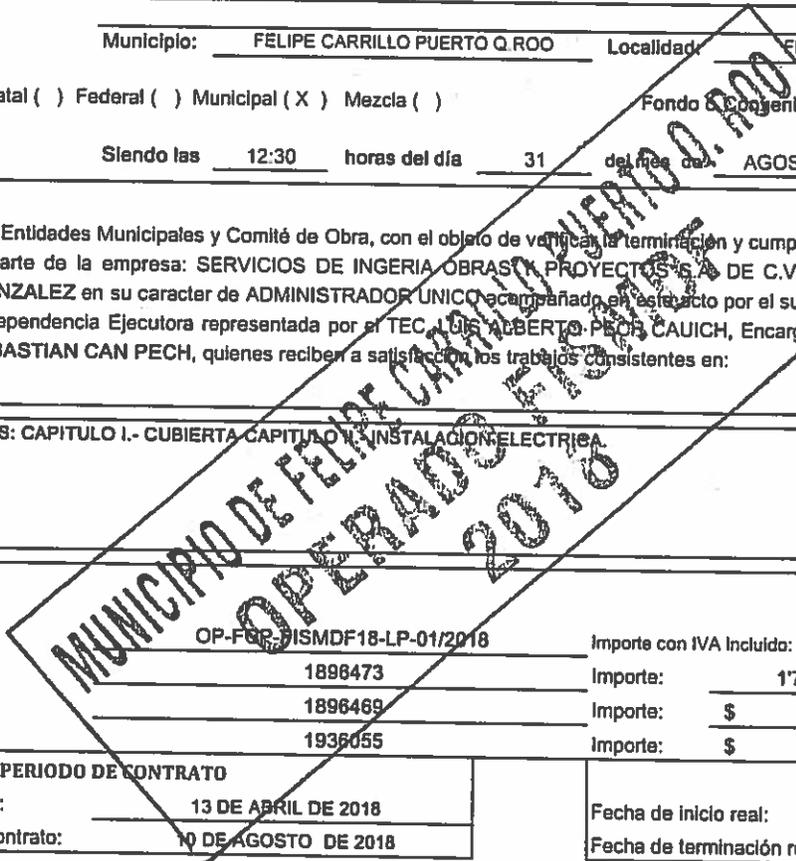

Información contractual

No. De contrato: OP-FCP-FISMDF18-LP-01/2018 Importe con IVA Incluido: 6'678,673.89

Garantía de anticipo: 1898473 Importe: 1'703,602.17

Garantía de cumplimiento: 1898469 Importe: \$ 567,867.39

Fianza de vicios ocultos: 1936055 Importe: \$ 653,469.51

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	13 DE ABRIL DE 2018	Fecha de inicio real:	20 DE ABRIL DE 2018
Fecha de terminación de contrato:	10 DE AGOSTO DE 2018	Fecha de terminación real:	31 DE AGOSTO DE 2018

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio: CM-01-OP-FCP-FISMDF18-LP-01/2018 Fecha de Convenio: 10 DE AGOSTO DE 2018

Plazo de ejecución: 134 DIAS Importe final contratado: 6'534,695.14

Estimaciones:

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (Uno)	1'099,276.06	
2 (Dos)	1'648,187.02	
3 (Tres)	2'194,656.44	
4 (Cuatro)		1'149,602.22
5 (Ultima y Finiquito)		\$ 442,973.40
Sumas	4'942,119.52	1'592,575.62
Inversión Ejercida	6'534,695.14	



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PUBLICA
OBRA POR CONTRATO
21V2119002**



001451

En caso de que La Obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida.			
Federal	Estatad	Municipal	Total
\$ -	\$ -	6'534,696.14	6'534,696.14

La empresa **SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.** y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISCALMENTE
2018

Entrega por la Empresa
SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Publicas

ING. EDGAR GILBERTO BUENIL GONZALEZ
Representante Legal

C. SEBASTIAN CAN PECH
Residente de la Obra

Testigos

Entrega por la Empresa

Por el Órgano de Control

ING. DANIEL ORLANDO TUN TUZ
Superintendente

CONTRALORIA MUNICIPAL

Por el Comité de Obra

C. VICTORIANO TUN HOIL
PRESIDENTE DEL COMITÉ
