



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

OBRA POR CONTRATO

OBRA:

25121018.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RUTA CHUNHUAS

LOCALIDAD:

ACTA GENERAL

CHUNHUAS, BETANIA, XPICHIL, HOBOMRICH, KAMPOCQICHE, FIDOMIENO MATA, DZOYOLA, SAN FRANCISCO AKE, DZULA, LAGUNA KANA, YOACTUN, X YATIL, SAN LUIS Y POLYDC, CHUNHUAS, RAMONAL, PRESIDENTE JUAREZ, SANTA LUCIA, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, NUEVA LORIA, NUEVO ISRAEL, EMILIANO ZAPATA, TABI Y YODZONOT NUEVO.

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas S.A DE C.V.

INVERSION POR LOCALIDAD

CONTRATADO
\$ 2,589,457.70

EJECUTADO
\$ 2,671,882.35

CONTENIDO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PRESUPUESTO DEFINITIVO
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERACIONES FISCALES
2018



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
25121018**



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 25121018.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RUTA CHUNHUAS


Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: ACTA GENERAL

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio RAMO 33.- FAISM

Siendo las 11:00 horas del día 6 del mes de AGOSTO del año 2018

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas S.A DE C.V. representada por el C. C.P. Angel Gustavo Flores Franco en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA acompañado en este acto por el superintendente de obra, C. Ing. Pedro Juventino Chiclim Kao; la Dependencia Ejecutora representada por el C. ING. LUIS ALBERTO PEZH CAUICH Encargado de la Dirección de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. ALBERTO ARCOPIRANCO GEO., quienes remiten a satisfacción los trabajos consistentes en :

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE LA RUTA CHUNHUAS, CONSISTENTE EN REPARACION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO CON EL CAMBIO DE BALASTRO, LAMPARA, BASE DE LAMPARA, FOTOCENDA, CAMBIO DE LAMPARAS LAS CUALES NO PUEDEN SER REPARADAS POR LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, UTILIZANDO EN ALGUNOS CASOS CONECTORES BIMETALICOS Y AISLADOR.

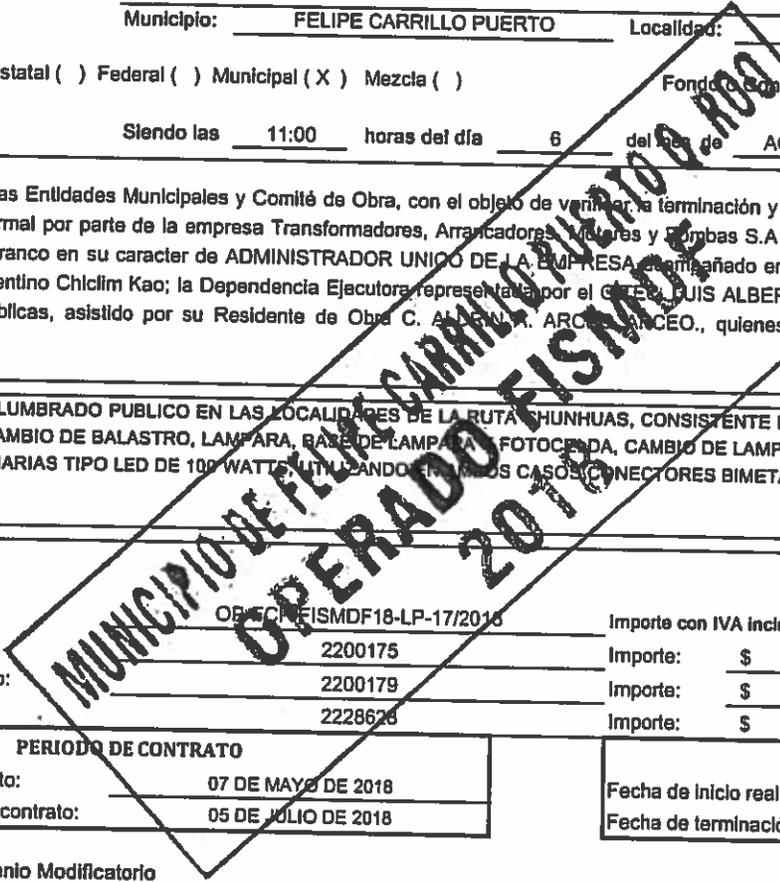

Información contractual			
No. De contrato:	<u>OB FCP FISIMDF18-LP-17/2018</u>	Importe con IVA incluido:	<u>\$ 2,589,457.70</u>
Garantía de anticipo:	<u>2200175</u>	Importe:	<u>\$ 776,837.35</u>
Garantía de cumplimiento:	<u>2200179</u>	Importe:	<u>\$ 258,945.77</u>
Fianza de vicios ocultos:	<u>2228628</u>	Importe:	<u>\$ 267,188.24</u>

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	<u>07 DE MAYO DE 2018</u>	Fecha de inicio real:	<u>07 DE MAYO DE 2018</u>
Fecha de terminación de contrato:	<u>05 DE JULIO DE 2018</u>	Fecha de terminación real:	<u>18 DE JULIO DE 2018</u>

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio: CM-01 Y CM-02-OP-FCP-FISIMDF18-LP-17/2018 Fecha de Convenio: 07 DE JULIO DE 2018

Plazo de ejecución: 71 DIAS Importe final: \$ 2,671,882.35

Estimaciones			
	Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
	<u>1 (Uno)</u>	<u>\$ 2,016,852.24</u>	
	<u>2 (Dos)</u>	<u>\$ 569,579.81</u>	
Sumas			<u>\$ 85,450.30</u>
Inversión Ejercida	<u>\$ 2,871,882.35</u>	<u>\$ 2,586,432.05</u>	<u>\$ 85,450.30</u>



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
25121018**



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejecida			
Federal	Estatad	Municipal	Tótal
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

La empresa Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas S.A DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

ENTREGA-RECEPCION
MUNICIPIO DE PROGRESO, QUINTANA ROO
OPERADO FISMDF 2018

Entrega por la Empresa
Transformadores, Arrancadores, Motores
y Bombas S.A DE C.V.

C. ING. PIERRO JUVENTINO HERNANDEZ KAP
Superintendente de Obra

Dirección de Obras Públicas

TEC. ALDRIN ADALBERTO ARCEO ARCEO
Residente de Obra

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Públicas

TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH
Encargado de Obras Públicas

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Supervisor de la Contraloría Municipal

Testigos

001433



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, artículo 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 25121018.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RUTA CHUNHUAS

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: ACTA GENERAL

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo de Fomento RAMO 33.- FAISM

Siendo las 11:00 horas del día 08 del mes de AGOSTO del año 2018; los representantes de las Entidades Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Direccion de Obras Publicas representada por el TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH en su carácter de Encargado de Obras Públicas, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento del alumbrado publico de la obra Ampliación de Red de Energía Eléctrica, en varias localidades de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo a la Direccion de Alumbrado Público representada por el C. SAMUEL GONZALEZ HERNANDEZ en su carácter de DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE LA RUTA CHUNHUAS, CONSISTENTE EN REPARACION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO CON EL CAMBIO DE BALASTRO, LAMPARA, BASE DE LAMPARA Y FOTOCELDA. CAMBIO DE LAMPARAS LAS CUALES NO PUEDEN SER REPARADAS POR LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, UTILIZANDO EN AMBOS CASOS CONECTORES BIMETALICOS Y...

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, a través de su representante legal, que se entrega de los planos correspondientes a la construccion final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y enterados de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
OPERADO FISINDEF
2018

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS

C. SAMUEL GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO

Por el Órgano de Control

Testigos

Obras Públicas

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MPAL

TEC. ALDIBALBERTO ARCEO ARCEO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Por la empresa

C. ING. PEDRO JUVENTINO CHICLIM KAO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
